


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

9月7日（月） ～ 9月20日（日）

【9/6更新】

<主な工事箇所>

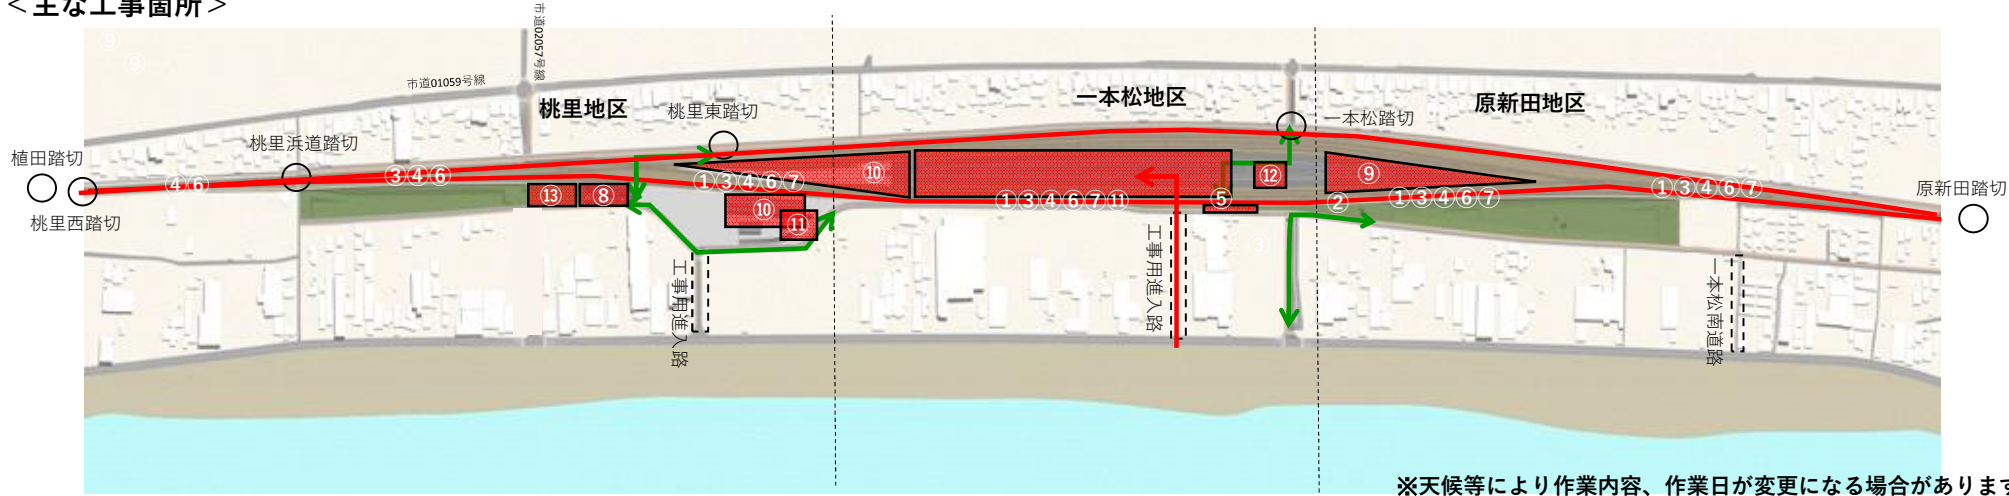

施工業者	施工場所	主な工事の内容	9月														備考
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
3	名工建設(株)	① 線間防護柵（ピン）設置工	休工							●	●	●	●	●	休工		大型車による製品等納入（フロント部～中道～名工現場事務所）
		② 保守用階段設置工	休工							●	●	●	●	●	休工		
4	名工建設(株)	③ 軌道整備工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		※作業時に大きめの騒音振動有
12	新生テクノス(株)	④ 電気工事（電車線設置撤去工等）	—	—	—	●	●	●	休工	—	—	—	●	●	●	休工	夜間工事：9/7、9/8、9/9、9/13 軌陸両用車：作業日
14	新生テクノス(株)	⑤ 電気工事（仮一本松踏切設備設置工	—	—	●	●	●	休工		—	●	—	●	—	—	休工	9/9：ミニバックホウ、9/11：生コン車
		⑥ 電気工事（ケーブル設置切換工）	—	—	—	●	—	休工		—	—	—	●	—	●	休工	夜間工事：9/10、9/17
23	名工建設(株)	⑦ 検査準備工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		9/18：竣工検査
24	新生テクノス(株)	⑧ 高圧ケーブル延線工	—	●	●	●	—	休工		—	—	—	—	—	休工		
29	新生テクノス(株)	⑨ 高圧ケーブル延線工	—	—	●	●	—	休工		—	—	—	—	—	休工		
33	名工建設(株)	⑩ 内外装工（仕上げ）	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		
35	新生テクノス(株)	⑪ 電気工事（端子箱設置工・電柱基礎工）	—	—	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	
37	名工建設(株)	⑫ 敷鉄板設置工・掘削工・土留め工	●	●	●	—	—	休工		●	●	●	●	●	休工		バックホウ、25tクレーン、50tクレーン
38	丸一工業(株)	⑬ 測量	—	—	—	—	—	休工		●	●	●	●	●	休工		
39	(株) 一杉興業	⑭ 地盤改良工等	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		中道車両通行止め：8/3～
