


# 新貨物ターミナル工事 2週間工程表

12月2日（月）～ 12月15日（日）

【12/2更新】

## <主な工事箇所>

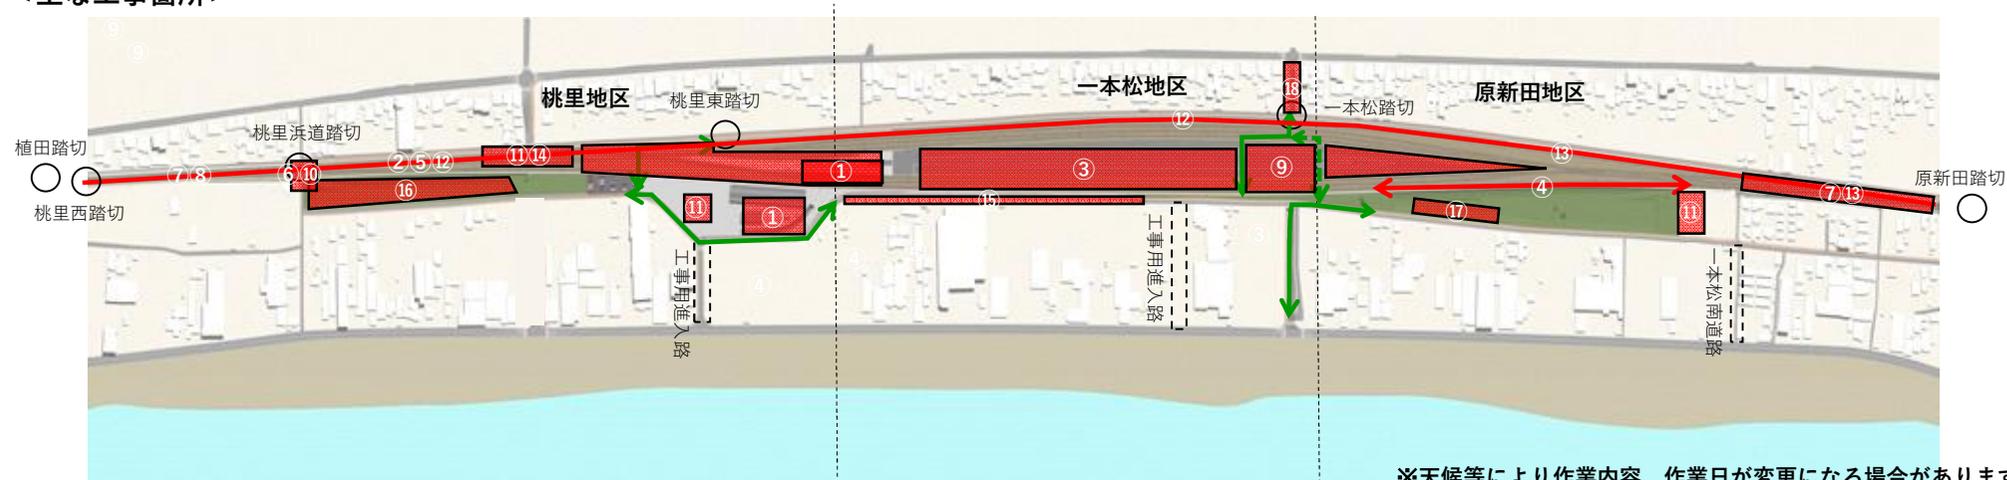

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

施工業者	施工場所	主な工事の内容	12月														備考
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
2	名工建設(株)	① 上部工（鉄筋、型枠、打設等）	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	コンクリート打設：12/10（月）6:00～22:00
3	名工建設(株)	② 排水工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品搬入等
		③ 小型管路設置工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
		④ 境界柵設置工、路盤工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
		⑤ 路床改良工	-	-	-	-	-	-		●	●	●	●	●			
4	名工建設(株)	⑥ 横断管路設置工	-	-	●	●	●	休工	-	-	-	-	-	休工	市道20160号線（桃里浜道踏切）車両通行止め		
		⑦ 砕石止め設置工	●	●	-	-	●		-	●	●	●	●				
		⑧ マクラギ取替工	-	-	-	-	-		●	●	-	-	-				
5	名工建設(株)	⑨ 箱型構造物工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	コンクリート打設：12/13（水）6:30～22:00
		⑩ 上水道工	-	-	-	-	-	休工	-	-	●	●	-	休工	市道20160号線（桃里浜道踏切）車両通行止め		
12	新生テクノス(株)	⑪ 電気工事（建柱工）	-	-	-	-	●	休工	-	-	-	-	-	休工	10 tトラック：電柱搬入		
		⑫ 電気工事（電車線設備改良工）	-	-	-	●	●		-	-	-	-	-				
13	新生テクノス(株)	⑬ 電気工事（建柱工）	-	-	-	-	-	休工	-	●	-	-	-	休工	4トンユニック：9:30～		
		⑭ 電気工事（電気設備管理柵工）	-	-	-	-	-		-	-	-	-	●				
19	大藤建設（株）	⑮ 掘削工・地盤改良工・擁壁工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	市道20166号線（中道）通行止め （R6.8/28～R7.3月下旬）		
20	(株)一杉興業	⑯ ブロック積工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		
21	落合建設（株）	⑰ ブロック積工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工			
22	落合建設（株）	⑱ 排水工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		
