


# 新貨物ターミナル工事 2週間工程表

1月13日（月）～ 1月26日（日）

【1/12更新】

## <主な工事箇所>

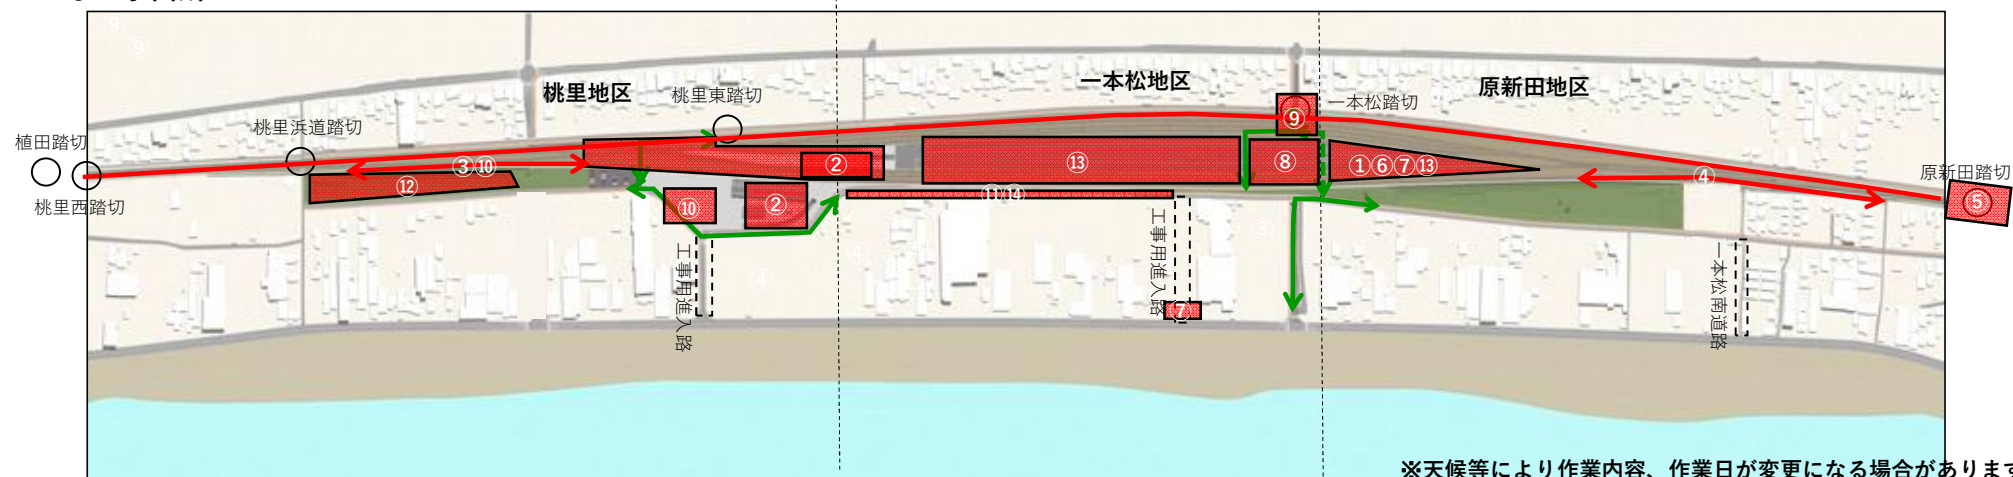

施工業者	施工場所	主な工事の内容	1月													備考	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
1 東亜道路工業(株)	①	線間防護柵設置工	-	-	-	●	●	休工	-	-	-	-	-	休工			
2 名工建設(株)	②	擁壁工（鉄筋、型枠、打設等）	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	25tクレーン、10tダンプトラック	
3 名工建設(株)	③	小型管路設置工、排水工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品搬入等	
	④	路床改良工、柵撤去設置工	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				●
4 名工建設(株)	⑤	横断管路設置工	●	●	●	●	●	休工	-	-	-	-	-	休工	原新田踏切通行止め：1/14～1/17 夜間作業：1/15		
	⑥	軌道新設工	-	-	-	-	-	休工	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：5～10台/日		
	⑦	レール運搬工、門扉改良工	-	-	-	-	-	●	休工	-	●	●	-	-	休工	トレーラー進入：1/21午前5時～	
5 名工建設(株)	⑧	箱型構造物工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	コンクリートポンプ車、25tクレーン	
13 新生テクノス(株)	⑨	地中穴開け工	-	-	-	-	-	休工	●	●	●	●	●	●	休工		
18 新生テクノス(株)	⑩	電気工事（建柱工、基礎工）	-	-	-	-	-	休工	-	●	-	-	-	●	休工	クレーン車、ユニック	
19 大藤建設(株)	⑪	掘削工・地盤改良工・擁壁工 水道管付替工	-	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	市道20166号線（中道）車両通行止め (R6.8/28～R7.3月下旬)	
20 (株)一杉興業	⑫	ブロック積工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		
23 名工建設(株)	⑬	軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		
25 (有)三和建業	⑭	掘削工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		
