


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

1月27日（月）～ 2月9日（日）

[1/26更新]

<主な工事箇所>

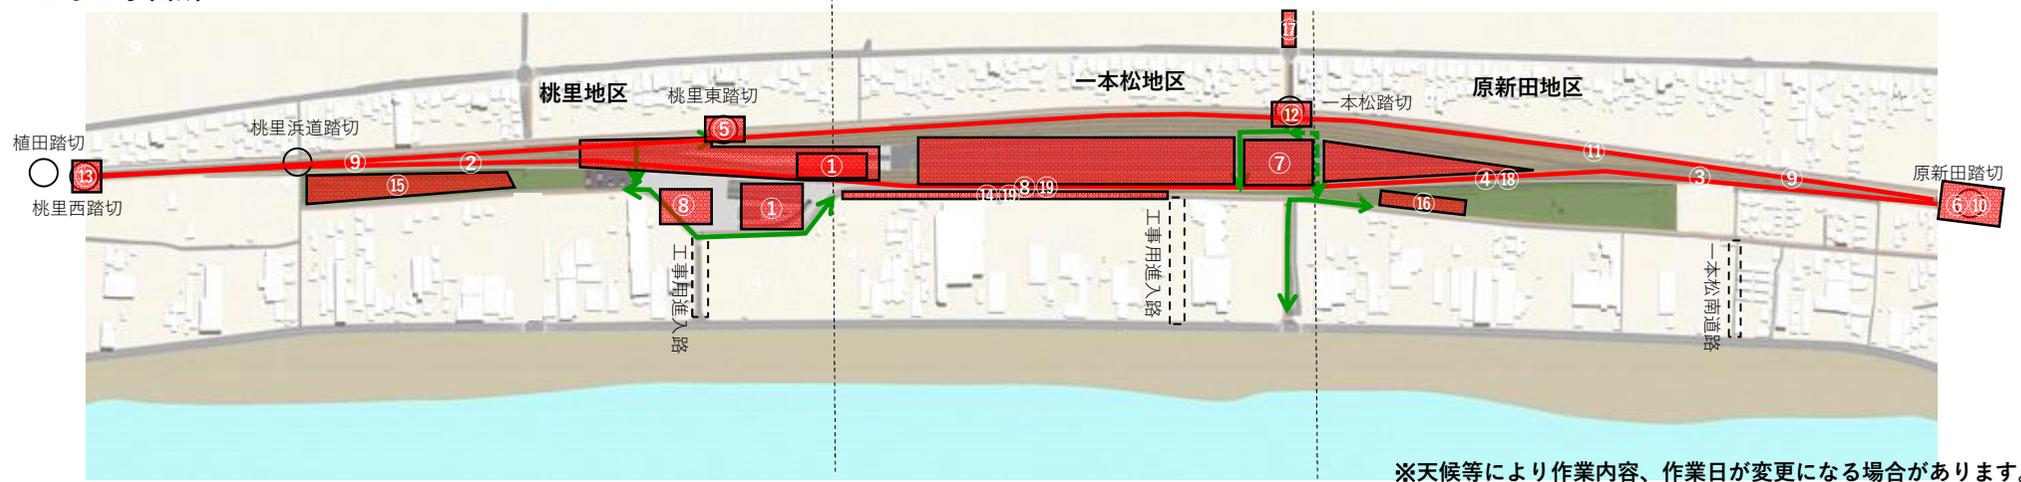

施工業者	施工場所	主な工事の内容	1月					2月									備考
			27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
2	名工建設(株)	① 擁壁工（鉄筋、型枠、打設等）	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	25tクレーン、10tダンプトラック
3	名工建設(株)	② 小型管路設置工、排水工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品搬入等
		③ 路床改良工、柵撤去設置工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
4	名工建設(株)	④ 軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～8台/日
		⑤ 管路設置工	-	-	-	-	-	休工	-	●	●	-	-	休工	桃里東踏切昼間車両通行止め (2/4、2/5：9時～17時)		
		⑥ 管路設置工	-	-	-	-	-	休工	-	-	-	-	-	休工	原新田踏切（通行止め無し）		
5	名工建設(株)	⑦ 箱型構造物工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	大型クレーン車	
12	新生テクノス(株)	⑧ 電気工事（建柱工）	-	-	●	-	-	休工	-	-	●	-	-	休工	休工	大型クレーン車、ユニック	
		⑨ 電気工事（基礎工）	-	-	-	-	-	休工	-	-	●	-	-				
13	新生テクノス(株)	⑩ 電気工事（ケーブル設置工）	-	-	-	-	●	休工	-	-	-	-	-	●	休工	桃里西踏切付近	
		⑪ 電気工事（ケーブル設置工）	-	-	-	-	●	休工	-	-	-	-	-	●	休工		
		⑫ 電気工事（掘削工）	-	●	●	●	●	休工	-	-	-	-	-	休工			
		⑬ 電気工事（金具取付工）	-	-	-	-	-	●	休工	-	-	-	-	-	休工		
19	大藤建設(株)	⑭ 掘削工・地盤改良工・擁壁工 水道管付替工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	市道20166号線（中道）車両通行止め (R6.8/28～R7.3月下旬)	
20	(株)一杉興業	⑮ ブロック積工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		
21	落合建設(株)	⑯ ブロック積工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工			
22	落合建設(株)	⑰ 排水工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	市道20144号線全面通行止め	
23	名工建設(株)	⑱ 軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	休工			
25	(有)三和建業	⑲ ブロック積工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		
