


# 新貨物ターミナル工事 2週間工程表

4月7日 (月) ~ 4月20日 (日)

【4/6更新】

## <主な工事箇所>

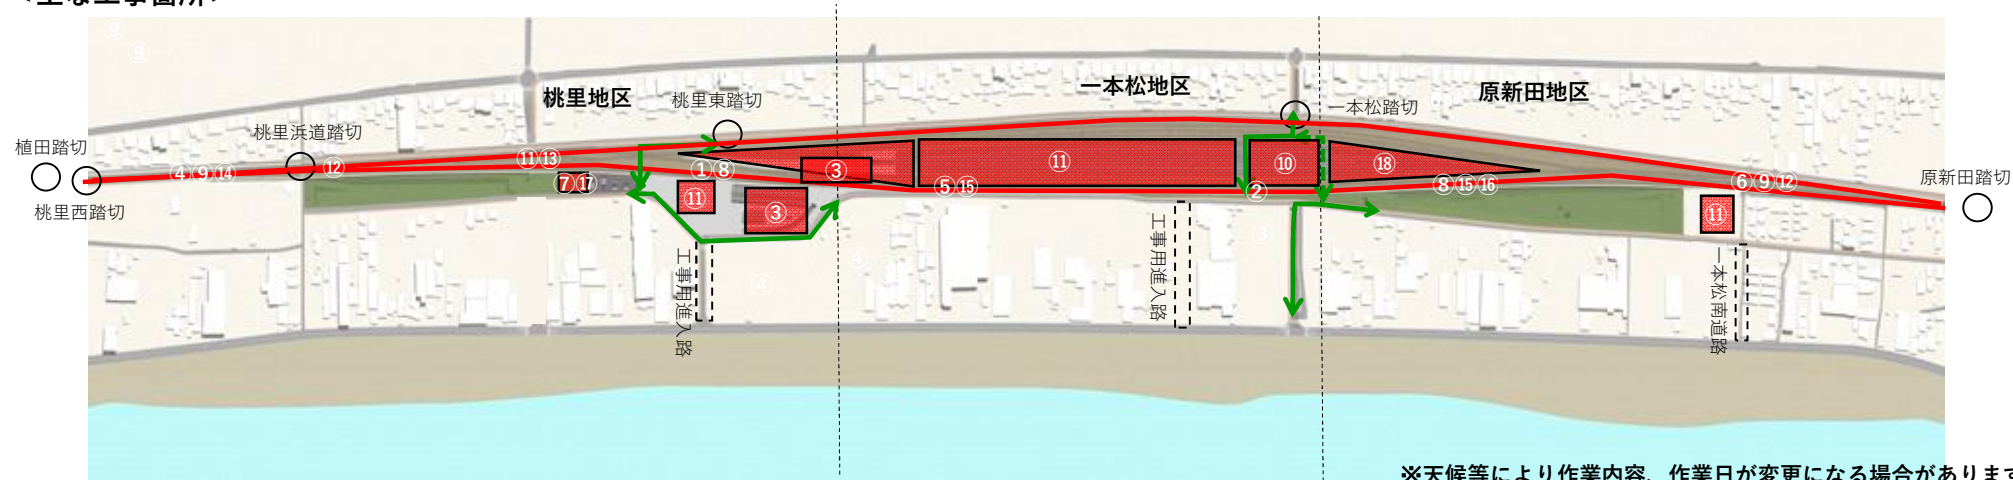

施工業者	施工場所	主な工事の内容	4月														備考
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
1 東亜道路工業(株)	①	路盤工 (軌道部)	-	-	●	●	●	休工	-	-	-	-	-	休工	10tダンプトラック：10台/日		
	②	排水工 (軌道部)	-	-	-	-	-	休工	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：1~3台/日		
2 名工建設(株)	③	擁壁工 (鉄筋、型枠、打設等)	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	25tクレーン、生コン車等		
3 名工建設(株)	④	路床入替工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品搬入等		
	⑤	張コンクリート工	●	●	●	●	●		-	-	-	-	-				
	⑥	小型電気管路設置工	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	⑦	仮囲い設置工・杭打設工	-	-	-	-	-		-	●	●	-	-			-	
4 名工建設(株)	⑧	軌道新設工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3~5台/日		
	⑨	マクラギ取替工	-	-	-	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	夜間工事：4/10 (木)、4/14 (月)、4/16 (水)、4/18 (金)		
		レール受台設置工	-	-	-	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工			
5 名工建設(株)	⑩	箱型構造物工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	25tクレーン、生コン車等		
12 新生テクノス(株)	⑪	電気工事 (電柱建柱・搬入)	-	-	-	-	-	休工	-	-	●	●	●	-	夜間工事：4/16 (水)、4/17 (木)、4/20 (金)		
	⑫	電気工事 (基礎掘削)	●	-	●	●	-	●	休工	-	●	●	●	-		●	休工
13 新生テクノス(株)	⑬	電気工事 (ポーリング工)	●	●	●	●	●	●	休工	-	●	●	●	-	-	休工	
	⑭	電気工事 (低圧線切替工)	-	-	-	-	-	休工	-	-	-	-	●	-	-	休工	
23 名工建設(株)	⑮	軌道新設工	●	●	●	●	●	休工	-	-	-	-	-	-	休工	10tダンプトラック：3~5台/日	
	⑯	分岐器設置工	-	-	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		休工
26 名工建設(株)	⑰	地盤改良杭工・仮設工等	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	15tトレーラー：4台	
	⑱	浄化槽設置工	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		休工
