

番号	18	令和2年度公共事業再評価調書		担当課名	砂防課	
事業名	急傾斜地崩壊対策事業			事業主体	静岡県	
箇所名	ヒラマツヤブシタ 平松藪下B地区			市町名	磐田市	
事業採択年度	平成28年度		計画期間	平成28年度～令和3年度		
用地着手年度	平成29年度		工事着手年度	平成29年度		
再評価理由	事業採択(H28)後5年間が経過した時点で継続中					
全体事業費	百万円 312	投資状況 (百万円)	～H30年度 122	R1年度 60	R2年度見込 60	計 242
事業概要	<p>(1)事業目的 平松藪下B地区は、磐田市北部に位置し、保全対象に人家20戸及び主要地方道磐田天竜線を含む急傾斜地である。 当該地区の斜面は荒廃し、豪雨等によるがけ崩れの発生により甚大な被害が懸念されるため、急傾斜地崩壊防止施設を整備し、住民の生命を守るものである。</p> <p>(2)事業内容 全体延長 延長430.4m 擁壁工 延長430.4m</p>					
事業の必要性	<p>【視点1】</p> <p>(1)事業を巡る社会情勢等の変化 近年、局地化、集中化した豪雨が頻発化し、甚大な土砂災害が多く発生している。磐田市においても、平成28年度からこれまでに、1件の土砂災害が発生している。当該地区では、過去に、人家裏で豪雨によるがけ崩れが発生しており、再度のがけ崩れの発生により、人家等に被害が及ぶことが懸念されるため、急傾斜地崩壊防止施設を整備する必要がある。 なお、保全対象者及び市担当者等にアンケートを実施したところ、計15名から回答があり、全ての回答者が「急傾斜地崩壊対策事業の継続の必要性を感じる」と回答しており、地元住民の事業に対する期待は非常に大きい。</p> <p>(2)事業の投資効果 費用対効果 B/C 2.3 経済的内部収益率 (EIRR) : 11.2% 総便益 : 863百万円 (直接被害 : 家屋、道路 間接被害 : 人的被害) 総費用 : 365百万円 (建設費、維持管理費)</p> <p>(3)事業の進捗状況 (令和2年度末見込み) 【事業費】 77.5% (242百万円/312百万円) 【事業量】 68.4% (294.8m/430.4m) 【用地取得】 85.9% (4,618m²/5,371m²)</p> <p>評価 <input checked="" type="radio"/> 継続が妥当 ・ 視点3による見直し後継続が妥当 ・ 継続は妥当ではない</p>					
今後の事業の進捗の見込み	<p>【視点2】</p> <p>当該地区では、平成29年度から工事に着手しており、現在は擁壁工の施工を行っている。事業に対する地元の要望は強く、用地取得や借地などの地元調整は円滑に行われていることから、今後も順調に事業が進捗する見込みである。</p> <p>評価 <input checked="" type="radio"/> 継続が妥当 ・ 視点3による見直し後継続が妥当 ・ 継続は妥当ではない</p>					
新たなコスト縮減・代替案立案等の可能性	<p>【視点3】</p> <p>擁壁工の設置位置については、残土排出が少なく、擁壁高を抑えられて最も経済的に優れる位置を比較検討により選定した上で決定している。 今後、工事を進める上で、現場発生土について、近隣の工事箇所と調整を図り、運搬費や処分費の低減を図り、コスト縮減に努める。</p>					
対応方針案	<p>(1)対応方針案 本事業を (<input checked="" type="radio"/> 継続) ・ 中止) する。</p> <p>(2)理由 本事業は、急傾斜地の崩壊による被害を未然に防止するものである。費用対効果も見込まれ、安全・安心な生活基盤に大きく寄与することから、事業を継続して早期完成を図る。</p>					

費用対効果算出説明書

「平松藪下B」急傾斜

(「急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル(案)」建設省砂防部)

総括表

総便益B	[事業を実施しない場合の被害額]－[事業を実施した場合の被害額]	863.4百万円
総費用C	[建設費]＋[評価期間内に必要な維持管理費]	365.3百万円
B/C		2.36

総便益

[急傾斜事業を実施しない場合の被害額]－[急傾斜事業を実施した場合の被害額]

年平均被害軽減期待額を評価対象期間56年(整備期間6年＋耐用期間50年)について累計する。
ただし、年平均被害軽減期待額は算出基準年(令和2年)に基づく社会的割引率(4.0%)で現在価値化したものとする。

$$\begin{aligned} \text{便益計} &= \sum_{n} \text{年平均被害軽減期待額} / (1+0.04) \\ &= 863.4 \text{百万円} \end{aligned}$$

※ 年平均被害軽減期待額: がけ崩れ発生の生起確率(1/10年超過確率降雨及び1/50年超過確率降雨)それぞれに対応した被害軽減額の平均値の合計。

※ 人的被害額/1人あたりは、1/50年超過確率降雨のみで発生し、市町の人口比率を反映した各年齢別の被害額の平均額である。その平均額を被害想定区域内の死者数を想定し乗じて人的被害額を算定する。

※ 整備期間中の被害軽減額は、事業費に比例して発生するものとする。

総費用



[建設費]＋[評価期間内に必要な維持管理費]

各年次の建設費と維持管理費(過去5ヶ年の平均値)を評価対象期間56年(整備期間6年＋耐用期間50年)について累計する。


ただし、各年次の建設費及び維持管理費は、算出基準年(令和2年)に基づくデフレータ及び社会的割引率(4.0%)で現在価値化したものとする。

$$\begin{aligned} \text{費用計} &= \sum \text{年間建設費} / (1+0.04) + \sum \text{年間維持管理費} / (1+0.04) \\ &= 362.8 \text{百万円} + 2.5 \text{百万円} \\ &= 365.3 \text{百万円} \end{aligned}$$


平松敷下B地区の位置

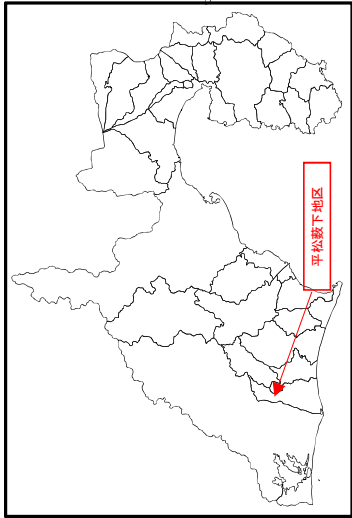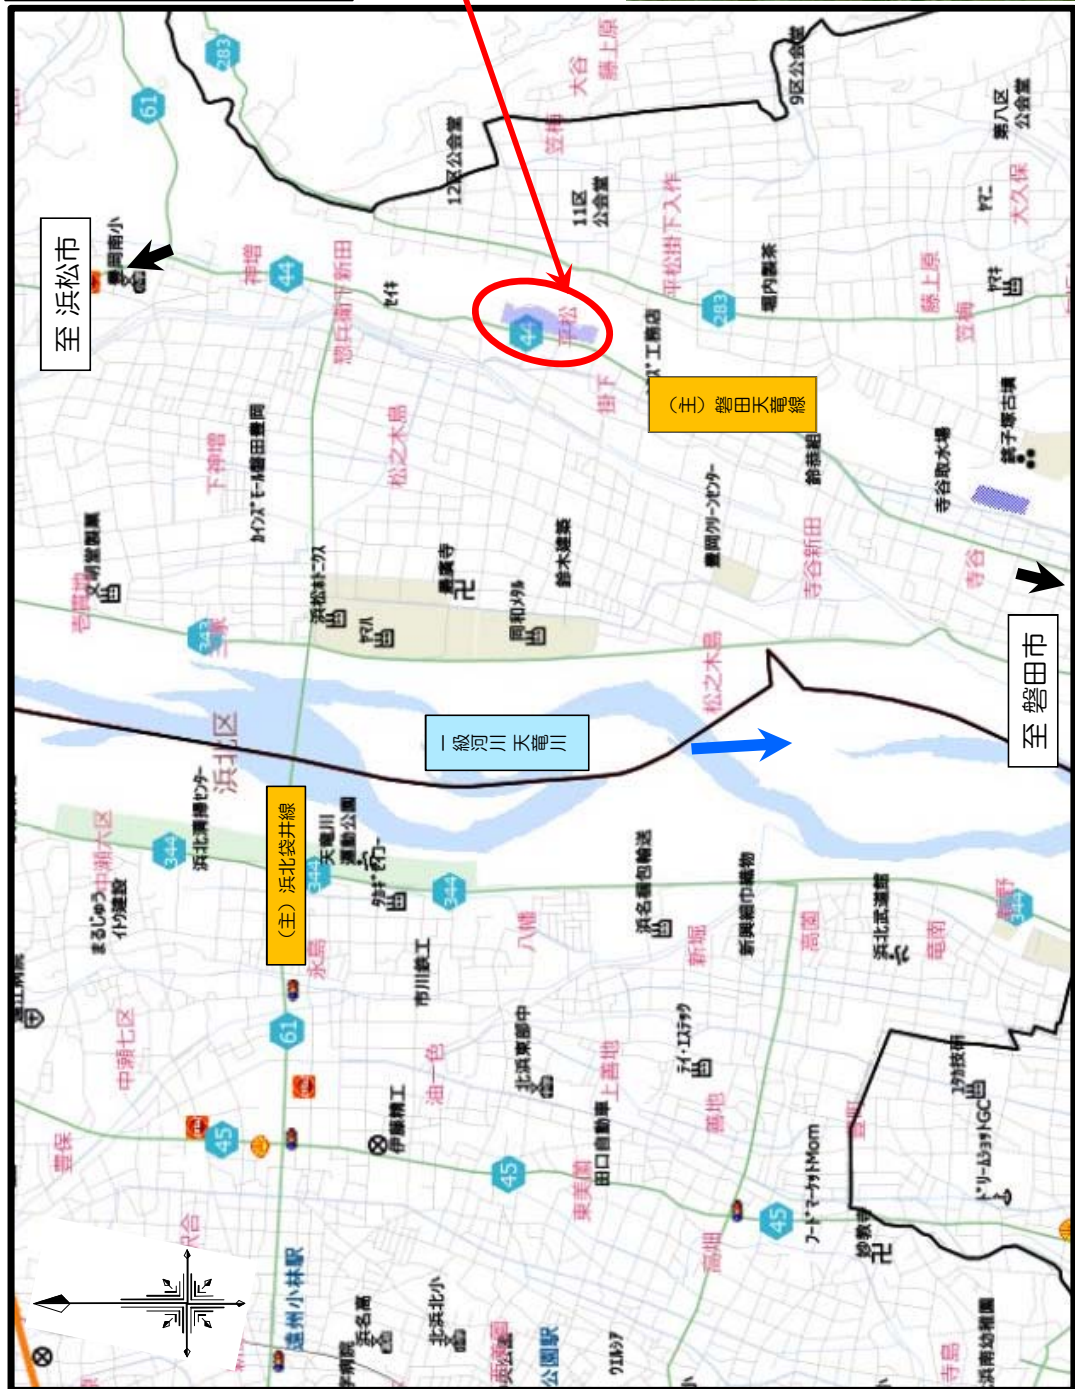

平松敷下B地区
急傾斜地崩壊危険区域
(磐田市平松)

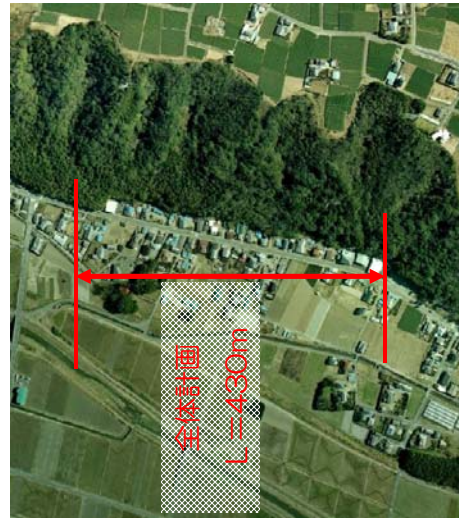

平松藪下B地区の事業概要

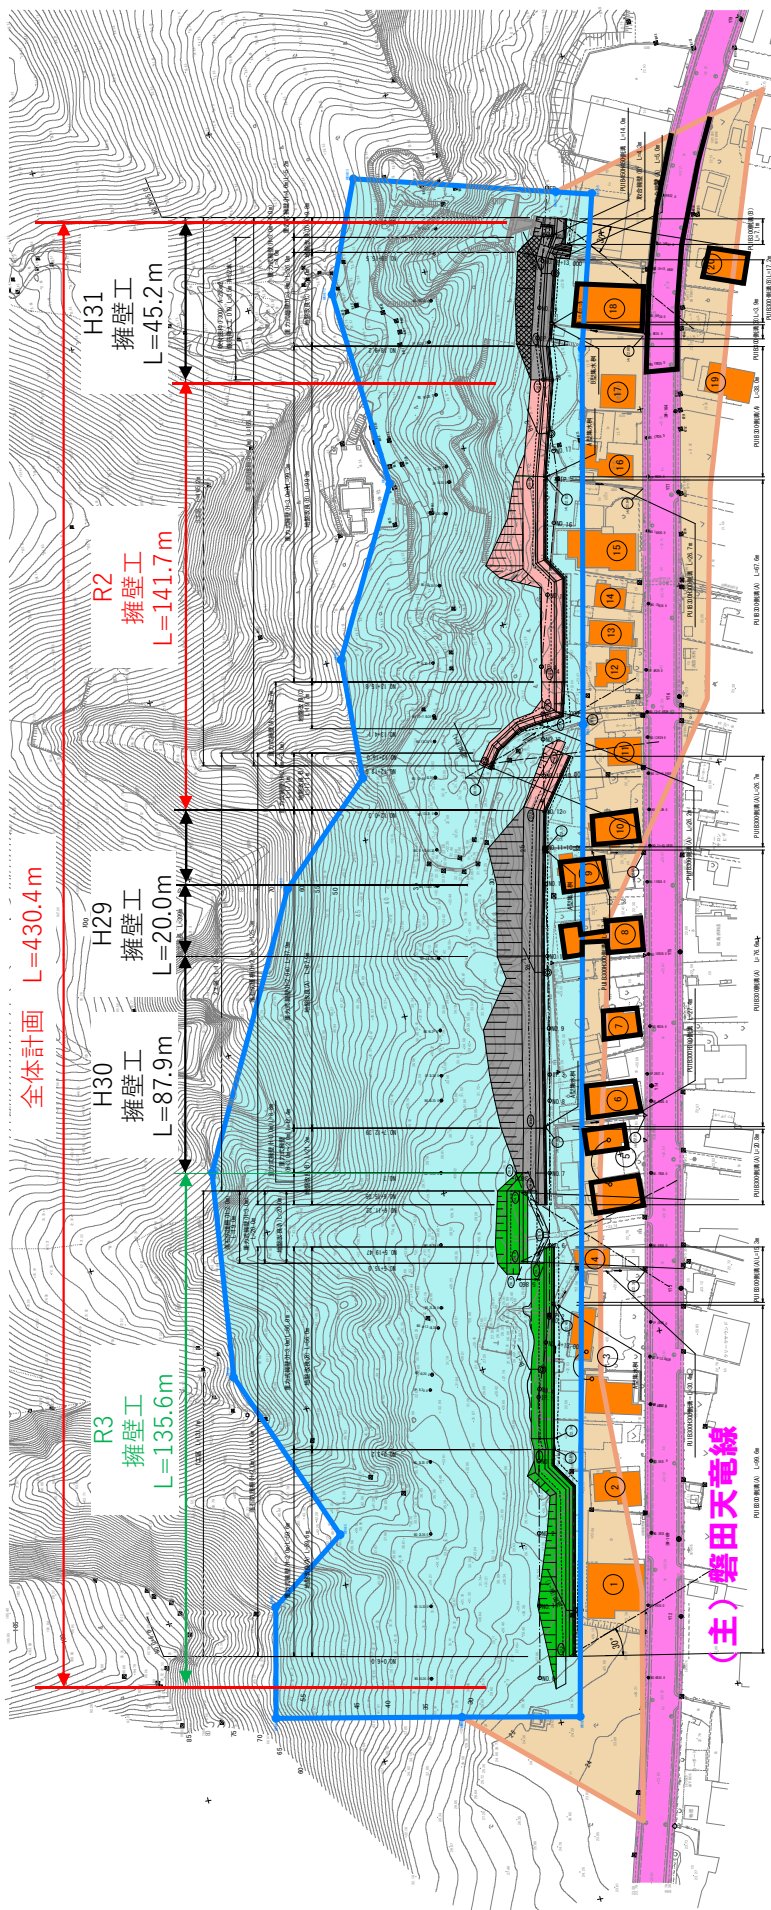


事業概要
 箇所名：平松藪下B（磐田市平松）
 事業費：312百万円
 計画期間：平成28～令和3年度
 全体延長：L=430.4m
 事業内容：擁壁工 L=430.4m

主な保全対象
 ■ 人家20戸
 ■ (主) 磐田天竜線 L=200.0m
 R1まで保全完了
 ■ 人家8戸
 ■ (主) 磐田天竜線 L=50.0m

【凡例】
 ■ H31までに整備完了 (L=153.1m)
 ■ R2整備完了予定 (L=294.8m)
 ■ R3以降施工予定 (L=135.6m)
 — 急傾斜地崩壊危険区域
 — 被害想定範囲

施設の整備状況と今後の対策工事

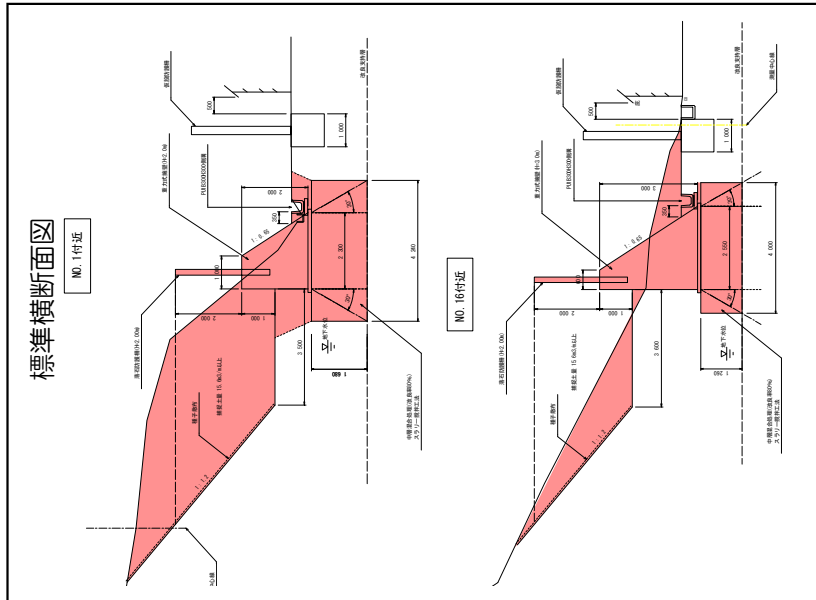

施設整備を継続し、
人家20戸、県道の
保全を図る

総便益	863百万円
総費用	365百万円
B/C	2.36

事業の進捗見込み(R2末)
● 事業費 77.5%
● 事業量 68.4%

① 整備済箇所



重力式擁壁工
(H=3.0m)

② 整備予定箇所



重力式擁壁工
(H=2.0m)



重力式擁壁工
(H=2.0m)
