

番号	16	令和3年度公共事業再評価調査		担当課名：砂防課		
事業名	急傾斜地崩壊対策事業		事業主体	静岡県		
箇所名	<small>コトタキウマイ</small> 横田久命		関係市町	賀茂郡松崎町		
事業採択年度	平成 19 年度		計画期間	平成19年度 ~ 令和4年度		
用地着手年度	平成 19 年度		工事着手年度	平成 19 年度		
再評価理由	再評価実施（H28）後5年間の経過した時点で継続中の事業					
全体事業費	百万円 604	投資状況 (百万円)	~R1年度 501	R2年度 26	R3年度見込 1	計 528
事業概要	<p>(1)事業目的 横田久命地区は、賀茂郡松崎町東部に位置し、保全対象に人家19戸と県道湯ヶ野松崎線を含む急傾斜地である。 当該地区の斜面は荒廃し、豪雨等によるがけ崩れの発生により甚大な被害が懸念されるため、急傾斜地崩壊防止施設を整備し、住民の生命を守るものである。</p> <p>(2)事業内容 全体延長 延長454.0m 擁壁工 延長454.0m</p>					
事業の必要性等	<p>【視点1】(1)事業を巡る社会経済情勢等の変化 近年、局地化、集中化した豪雨が頻発し、甚大な土砂災害が多く発生しており、令和2年度県政世論調査では台風や地震などの自然災害に対する不安の声もあった。 松崎町においても、平成29年度からこれまでに9件の土砂災害が発生している。 当該地区では、がけ崩れの発生により、人家や県道等に被害が及ぶことが懸念されるため、急傾斜地崩壊防止施設を整備する必要がある。</p> <p>(2)事業の投資効果 費用対効果 B/C : 3.4                      経済的内部収益率 (EIRR) : 12.2% 総便益 : 2,569百万円 (直接被害 : 家屋、道路、人的被害 間接被害 : 精神的被害) 総費用 : 751百万円 (建設費、維持管理費)</p> <p>(3)事業の進捗状況 (令和3年度末見込み) 【事業費】87.4% (528百万円/604百万円) 【事業量】89.1% (404.4m/454.0m) 【用地取得】89.1%</p> <p>評価 <input checked="" type="radio"/> 継続が妥当 ・ 視点3による見直し後継続が妥当 ・ 継続は妥当ではない</p>					
今後の事業の進捗の見込み	<p>【視点2】保全対象の5世帯にアンケートを実施したところ、5世帯が「事業を継続する必要性を感じる」と回答しており、事業に対する地元住民からの要望は強い。 用地取得は令和3年度に完了する見込みで、借地などの地元調整は円滑に行われていることから、工事を計画的に推進し、令和4年度の完了が見込まれる。</p> <p>評価 <input checked="" type="radio"/> 継続が妥当 ・ 視点3による見直し後継続が妥当 ・ 継続は妥当ではない</p>					
新たなコスト縮減・代替案立案等の可能性	<p>【視点3】擁壁は、崩壊の要因と形態を想定し、工事対象範囲や経済性等を勘案して、比較検討により決定している。 今後、工事を進めるうえで、現場発生土について、近隣の工事箇所と調整を図り、運搬費や処分費の低減を図り、コスト縮減に努める。</p>					
対応方針(案)	<p>(1)対応方針(案) 本事業を ( <input checked="" type="radio"/> 継続 ) ・ 見直し後継続 ・ 中止 ) する。</p> <p>(2)理由 本事業は、急傾斜地の崩壊による被害を未然に防止するものである。費用対効果も見込まれ、人家や県道の保全など安全・安心な生活基盤に大きく寄与することから、事業を継続する。</p>					

## 費用対効果算出説明書

### 「横田久命」急傾斜

(「急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル(案)」国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部)

#### 総括表

総便益B	[事業を実施しない場合の被害額]－[事業を実施した場合の被害額]	2,569百万円
総費用C	[建設費]+[評価期間内に必要な維持管理費]	751百万円
<b>B/C</b>		<b>3.4</b>

#### 総便益

[急傾斜事業を実施しない場合の被害額]－[急傾斜事業を実施した場合の被害額]

年平均被害軽減期待額を評価対象期間66年(整備期間16年+耐用期間50年)について累計する。  
ただし、年平均被害軽減期待額は算出基準年(令和3年)に基づく社会的割引率(4.0%)で現在価値化したものとする。

$$\begin{aligned} \text{便益計} &= \sum \text{年平均被害軽減期待額} / (1+0.04)^n \\ &= 2,569 \text{百万円} \end{aligned}$$

※ 年平均被害軽減期待額: かけ崩れ発生 of 生起確率(1/10年超過確率降雨及び1/50年超過確率降雨)それぞれに対応した被害軽減額の平均値の合計。

※ 人的被害額/1人当りは、1/50年超過確率降雨のみで発生し、市町の人口比率を反映した各年齢別人的被害額の平均額である。その平均額を被害想定区域内の死者数を想定し乗じて人的被害額を算定する。

※ 整備期間中の被害軽減額は、事業費に比例して発生するものとする。

#### 総費用

[建設費]+[評価期間内に必要な維持管理費]

各年次の建設費と維持管理費(過去5ヶ年の平均値)を評価対象期間66年(整備期間16年+耐用期間50年)について累計する。

ただし、各年次の建設費及び維持管理費は、算出基準年(令和3年)に基づくデフレータ及び社会的割引率(4.0%)で現在価値化したものとする。

$$\begin{aligned} \text{費用計} &= \sum \text{年間建設費} / (1+0.04)^n + \sum \text{年間維持管理費} / (1+0.04)^n \\ &= 748 \text{百万円} + 3 \text{百万円} \\ &= 751 \text{百万円} \end{aligned}$$

# 横田久命地区の位置

静岡県 賀茂郡松崎町 大澤



2005.7がけ崩れ状況



保全対象（一）湯ヶ野松崎線




## 事業概要

### 前回からの変更点・理由

	前回 (H28)	今回 (R3)	主な変更理由
①計画期間	H19～H30	H19～R4 (+4年)	・地元調整が整い事業範囲を追加した結果、事業期間を延伸した
②全体事業費	484百万円	604百万円 (+120)	・地元調整が整い事業範囲を追加した結果、事業費が増大した

# 横田久命地区の事業概要

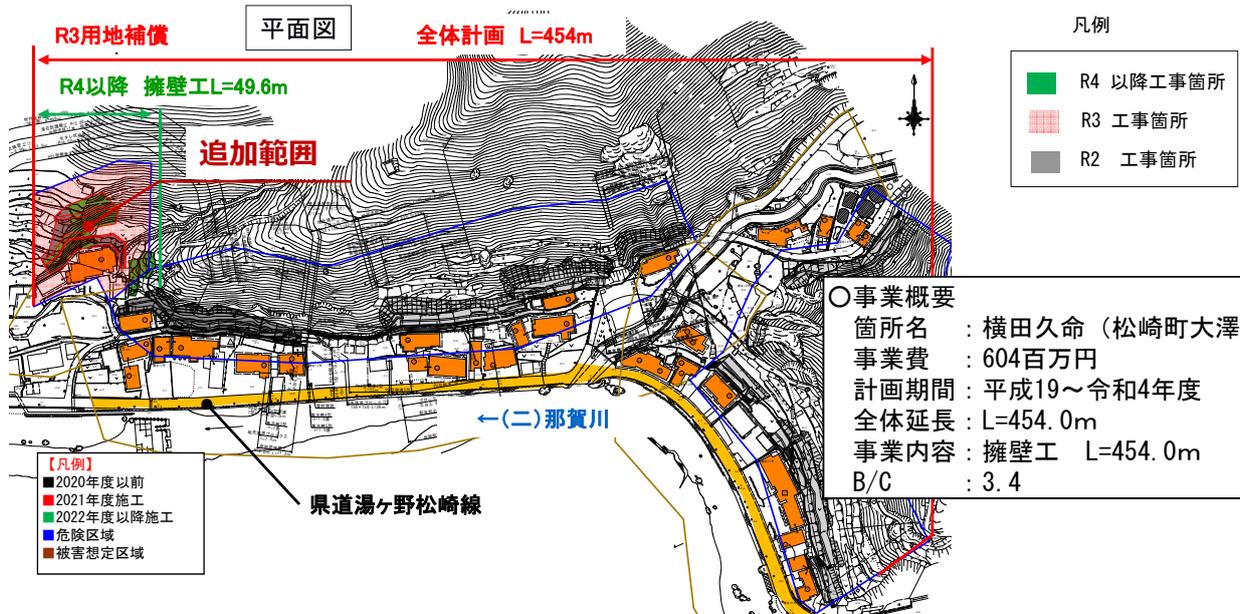

○事業概要  
 箇所名 : 横田久命 (松崎町大沢)  
 事業費 : 604百万円  
 計画期間 : 平成19~令和4年度  
 全体延長 : L=454.0m  
 事業内容 : 擁壁工 L=454.0m  
 B/C : 3.4



○主な保全対象  
 ・ 人家19戸  
 ・ 県道湯ヶ野松崎線 415m

## 施設の整備状況と今後の対策工事


溪流名 : 横田久命 (賀茂郡松崎町大沢地区)  
 事業期間 : 平成19年度~令和4年度  
 事業費 : 604百万円  
 事業量 : 全体延長 L=454.0m  
 擁壁工 L=404.4m (R3末見込み)



R2施工箇所起点側



R2施工箇所起終点側

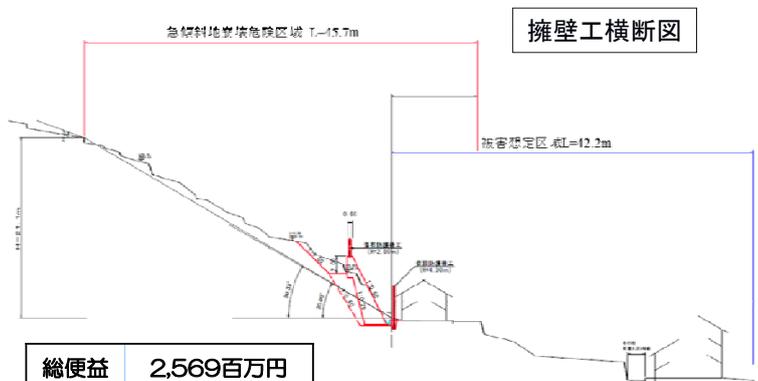

総便益	2,569百万円
総費用	751百万円
B/C	3.4

事業の進捗見込み (R3末)  
 ● 事業費 87.4%  
 ● 事業量 89.1%

施設整備を継続し、  
 人家19戸、県道の  
 保全を図る
