

(様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	静岡県における力強い産地づくりに向けた漁港整備と環境整備の推進									
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度			交付対象	静岡県					
計画の目標	漁港交流人口の増加、漁船が安全で効率的に係留できる施設の保全、水域及び集落の環境保全を目指し、力強い産地づくりに向けた漁港整備を推進する。									
計画の成果目標 (定量的指標)	①緑地や広場の整備によって、漁港来訪者を年間7.4万人増加させる (焼津地区、福田地区、初島地区) ②漁船が安全に係留できる改良済み施設延長を111隻分増加させる (榛南地区、下田地区) ③良好な水域環境保全のため、年間75トンの水域ゴミを処分する (焼津地区) ④良好な集落環境保全のため、漁業集落排水処理施設の機能保全計画を策定する (妻良地区、田牛地区)									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
				当初現況値	中間目標値	最終目標値				
				(H22当初)	(-)	(H26末)				
① 漁港環境施設の利用人数増加数 (H26実績-H21実績)				0 千人	(-)	740 千人				
② 改良済み施設に係留できる漁船の増加数 (改良済み延長/船幅)				0 隻	(-)	111 隻				
③ 焼津漁港の水域ごみの回収量 (H27実績)				0 t	(-)	75 t				
④ 漁業集落排水処理施設の機能保全計画を策定済みの地区数				0 地区	(-)	2 地区				
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,659 百万円	A	1,531 百万円	B	128 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0%

静岡県社会資本整備重点計画における位置づけ									
第2期 (H20~H24)					第3期 (H25~H29)				
分野名	活力・交流				分野名	活力・交流			
目標名	力強い農林水産業を支える基盤整備の推進				目標名	農林水産業の新たな展開			
指標名	力強い産地づくりに向けた漁港の整備数	目標値 (H24)	36漁港		指標名	機能の保全を図った漁港施設数の割合	目標値 (H29)	100.0%	

事後評価

1. 交付対象事業の進捗状況 (○:計画期間中に完成 △:計画期間終了後に完成見込 (備考欄に完成予定時期を記入) -:その他 (備考欄に具体的に記入 (中止、未実施等))

交付対象事業																		
A 漁港事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	漁港種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考
											H22	H23	H24	H25	H26			
A1	漁港	離島	静岡県	間接	熱海市	1種	改築	地域水産物供給基盤整備 (初島地区)	護岸L=52m	熱海市						466	△	H28
A2	漁港	一般	静岡県	直接	静岡県	特3種	新設	漁港環境整備 (焼津地区)	緑地広場A=4.1ha	焼津市						424	△	H27
A3	漁港	一般	静岡県	直接	静岡県	4種	新設	漁港環境整備 (福田地区)	緑地広場A=2.0ha	磐田市						60	○	
A4	漁港	一般	静岡県	間接	吉田町	2種	改築	地域水産物供給基盤整備 (榛南地区)	岸壁改良L=160m	吉田町						267	△	H31
A5	漁港	一般	静岡県	間接	下田市	1種	新設	地域水産物供給基盤整備 (下田地区)	物揚場L=110m、防波堤L=10m	下田市						185	○	
A6	漁港	一般	静岡県	直接	静岡県	特3種	保全	水域環境整備 (焼津地区)	清掃船1隻	焼津市						110	○	
A7	漁港	一般	静岡県	間接	南伊豆町	1種	保全	漁業集落環境整備 (妻良地区)	集落排水施設 診断1式	南伊豆町						7	○	
A8	漁港	一般	静岡県	間接	下田市	1種	保全	漁業集落環境整備 (田牛地区)	集落排水施設 診断1式	下田市						12	○	
											合計	1,531						
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26				
A5	漁港	一般	静岡県	間接	下田市	新設	漁港施設機能強化事業	防波堤L=10m	下田市							128	○	
											合計	128						

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		
	施設の完成を早め、事業効果を早期に発現する。																
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業 者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	進捗 状況	備考
										H22	H23	H24	H25	H26			
A2	漁港	一般	静岡県	直接	静岡県	新設	漁港環境整備（焼津地区）	浮棧橋1基	焼津市							-	未実施
A4	漁港	一般	静岡県	間接	吉田町	新設	地域水産物供給基盤整備（榛南地区）	水域施設改良計画	吉田町							-	未実施
										合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		

（参考） 計画の成果目標を同一とする地域自主戦略交付金の交付対象事業  
 【H23】 EのNO.1～4 【H24】 E1のNO.14～16、23  
 （別添「事業実施計画」参照）

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>焼津地区及び福田地区において、緑地広場を整備し、漁港来訪者が増加した。</li> <li>岸壁の新設及び泊地の浚渫を行い、安全な陸揚げ作業と漁船の係留が可能となった。</li> <li>焼津漁港において清掃船を更新し、水域ごみの回収によって水域環境が保全された。</li> <li>漁業集落排水処理施設の計画的なメンテナンスを行うための機能保全計画を策定した。</li> </ul>				
II 定量的指標の達成状況	指標①（漁港環境施設の利用人数）	最終目標値	7.4万人	目標値と実績値に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>焼津漁港の石津工区においては、PRの結果、日常的な利用が継続しているため。</li> <li>福田漁港の緑地広場においては、磐田市と連携して水産物飲食提供の社会実験を行い、相乗効果で来訪者が増加したため。</li> <li>榛南地区において、岸壁の詳細調査の結果、工事数量が増加し、事業を継続しているため。</li> <li>計画時と比べて年度毎の水域ごみの回収量が減少する傾向にあるため。</li> </ul>	
		最終実績値	8.9万人			
	指標②（改良済み施設に係留できる漁船の増加数）	最終目標値	111隻			
		最終実績値	106隻			
	指標③（焼津漁港の水域ごみの回収量）	最終目標値	75 t			
		最終実績値	63.8 t			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）						

3. 特記事項（今後の方針等）  
 事業未完了箇所について、次期計画期間中の完成を目指す。

(様式 6) 社会資本総合整備計画 (参考図面)

計画の名称	静岡県における力強い産地づくりに向けた漁港整備と環境整備の推進		
計画の期間	平成22年度	～	平成26年度
交付対象	静岡県		


## 静岡県漁港図

### 指定漁港数

種別 (色別)	港数	管理者別 (県) (市町)	
第1種 ●	34	—	34
第2種 ●	9	3	6
第3種 (特定含む) ●	4	3	1
第4種 ●	2	2	—
総数	49	8	41

漁港名 …… 県管理漁港

平成27年3月現在

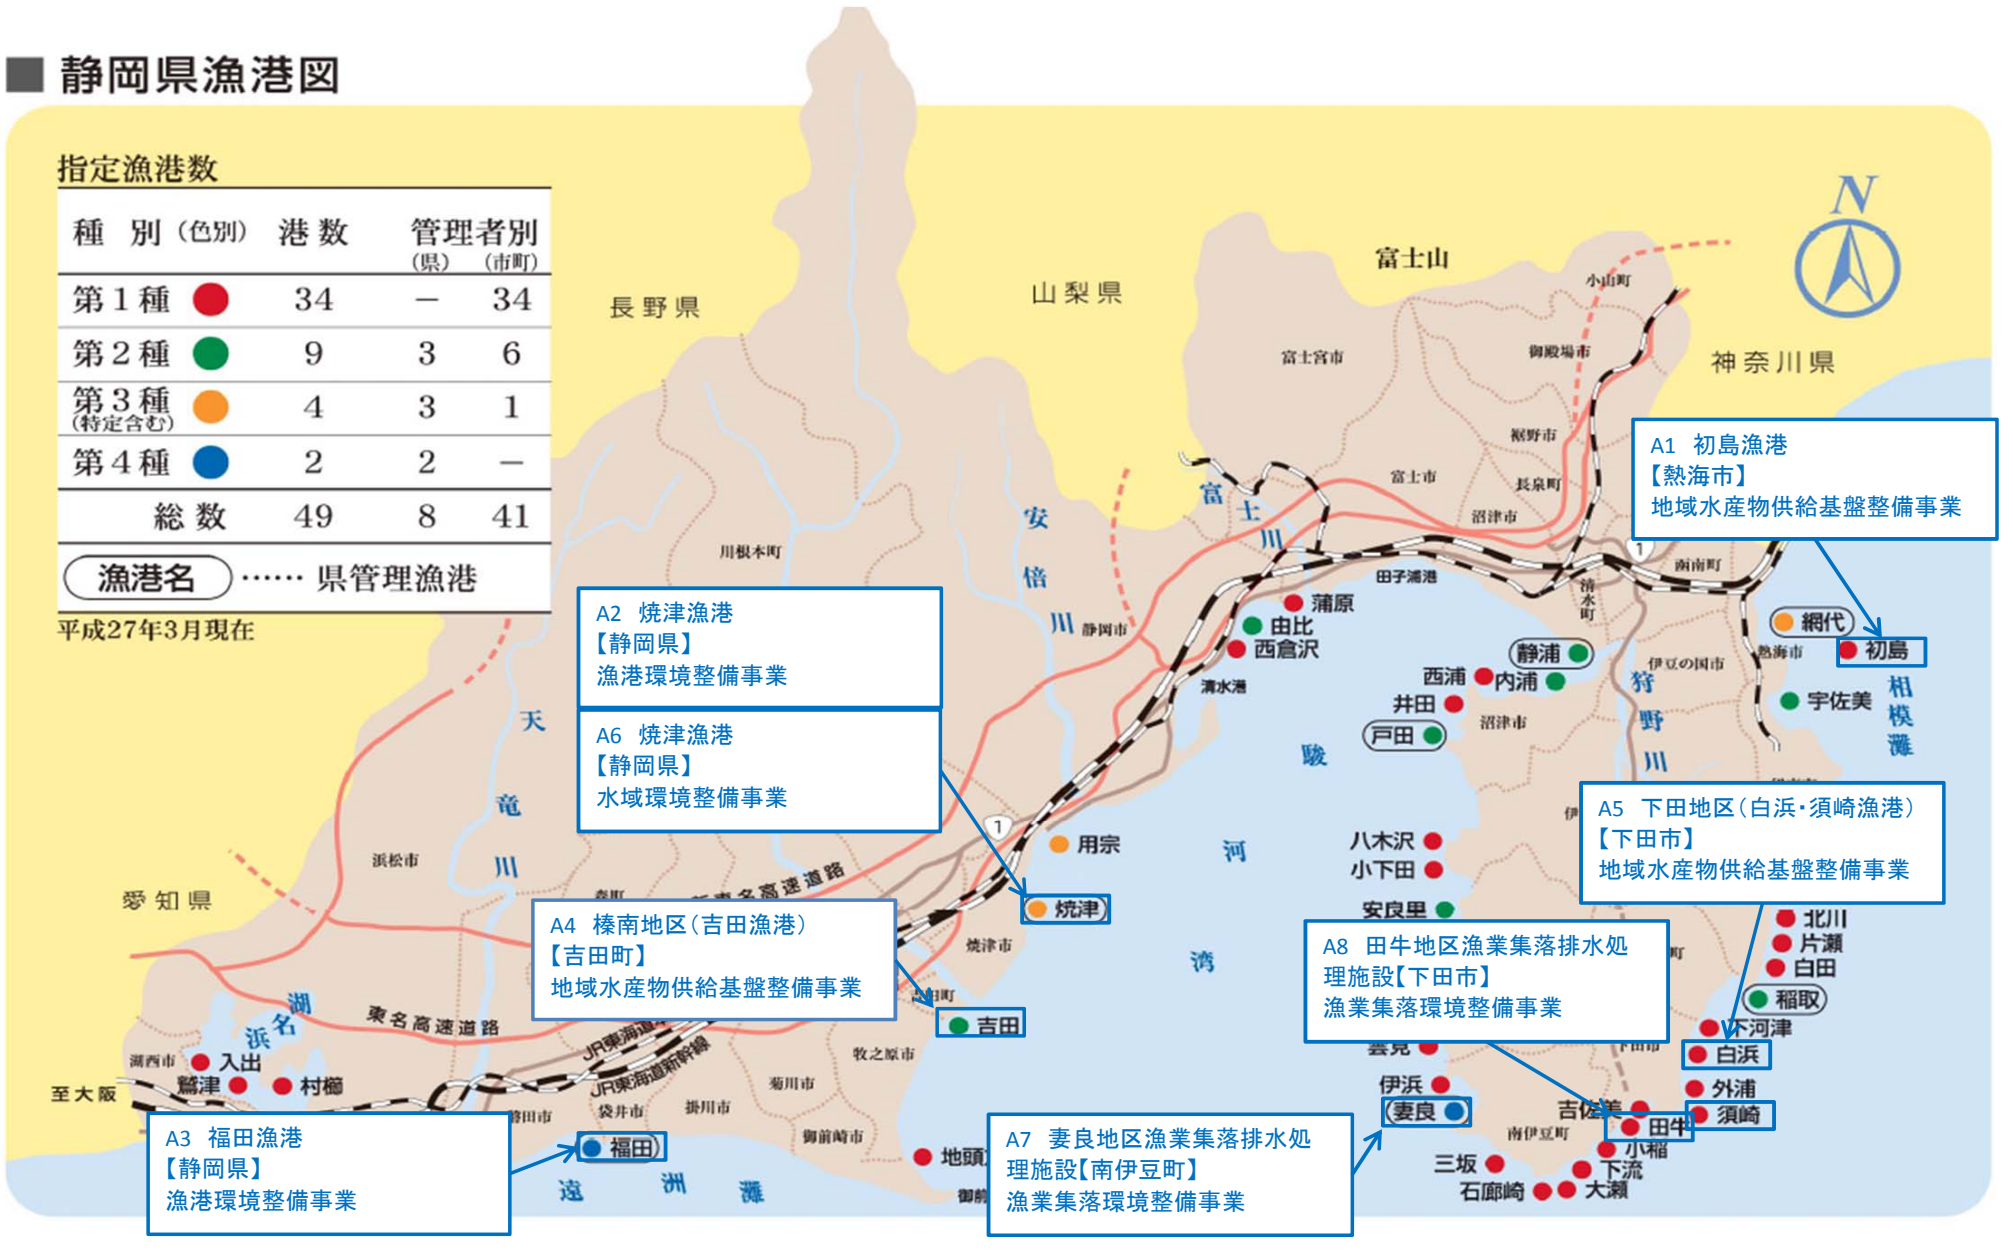

(参考資料)

## 地域自主戦略交付金 事業実施計画

平成23年度 地域自主戦略交付金 事業実施計画 (最終報告) E:農山漁村地域整備に関する事業

No.	事業名	地区名
1	地域水産物供給基盤整備事業	下田地区(須崎漁港・白浜漁港)
2	地域水産物供給基盤整備事業	初島地区(初島漁港)
3	漁港環境整備事業	焼津漁港
4	漁港環境整備事業	福田漁港
5	海岸耐震対策事業	網代漁港
6	海岸耐震対策事業	戸田漁港
7	津波・高潮危機管理対策事業	静浦漁港

平成24年度 地域自主戦略交付金 事業実施計画 E:農山漁村地域整備に関する事業

No.	事業名	地区名
14	地域水産物供給基盤整備事業	下田地区(須崎漁港・白浜漁港)
15	地域水産物供給基盤整備事業	榛南地区(吉田漁港)
16	漁港環境整備事業	焼津漁港
17	海岸耐震対策事業	戸田漁港
18	津波・高潮危機管理対策事業	静浦漁港
23	地域水産物供給基盤整備事業	初島地区(初島漁港)

平成24年度 地域自主戦略交付金 事業実施計画 (予備費) E:農山漁村地域整備に関する事業

No.	事業名	地区名
2	海岸耐震対策事業	戸田漁港
