

～静岡県は、一日も早い復旧、復興を目指し、全力で逢初川の工事等を進めます～

静岡県熱海土木事務所 広報誌

## 逢初川源頭部土砂撤去工事の完了に向けて引き続き邁進します。

令和3年7月の土石流災害によりお亡くなりになりました方々の御冥福を心よりお祈りするとともに、被災されました皆様にお見舞いを申し上げます。

今なお多くの方が避難生活を続けられている最中ではありますが、熱海土木事務所では、被災した地域の安全を確保するため、逢初川の復旧や源頭部の不安定土砂の撤去を進めています。

行政代執行により進めております逢初川源頭部の不安定土砂撤去については、4月以降のまとまった降雨の影響により工事に遅れが生じておりましたが、作業体制を増強するなどにより遅れの回復に取り組んでおります。6月末頃までには不安定盛土の撤去を完了し、9月に予定している警戒区域の解除に影響のないよう進めてまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

### 1 逢初川源頭部土砂撤去工事（行政代執行）の進捗状況

土砂の撤去作業は、日曜祝日の作業や重機の増強により急ピッチで進めています。例年より早い梅雨入りを迎え天候との闘いが続きますが、6月末頃までの土砂撤去完了を目指し、作業を進めます。

#### 土砂撤去の進捗状況

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Aブロック | 土砂の掘削は最終段階。土砂搬出作業を実施中。 |
| Bブロック | 安定勾配での掘削作業完了。          |
| Cブロック | 土砂の撤去完了。               |
| Dブロック | 6月中旬着手予定。              |





↑ 土砂撤去工事状況（令和5年6月6日）



## 2 逢初川源頭部土砂撤去工事（行政代執行）の今後の予定

今後は、土砂撤去後の長期にわたる法面の安定を図るため、Dブロックの土砂撤去と同時に、植生による法面保護と排水を実施します。

| 令和5年<br>3月 | 4月 | 5月 | 6月           | 7月 | 8月 | 9月              |
|------------|----|----|--------------|----|----|-----------------|
| 不安定土砂撤去・搬出 |    |    | 法面保護・排水      |    |    | ●警戒区域解除<br>(予定) |
|            |    |    | 工事用道路撤去・後片付け |    |    |                 |

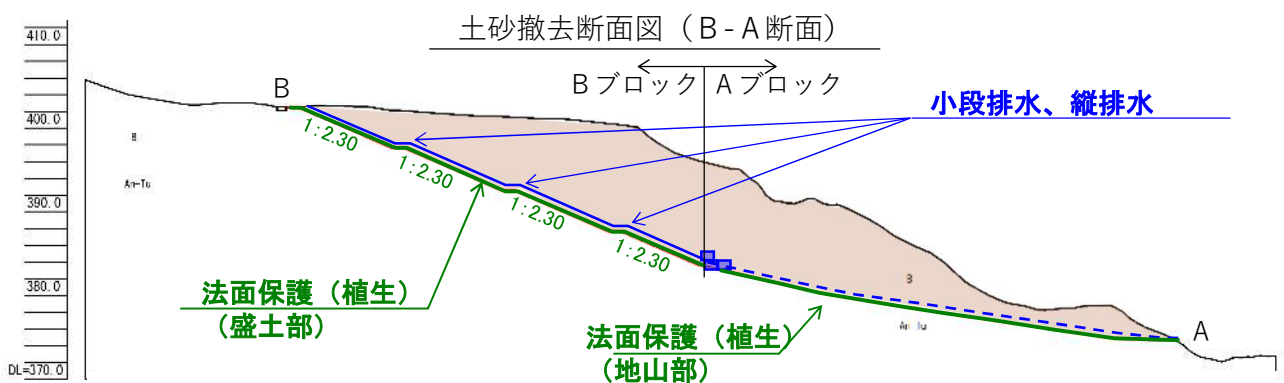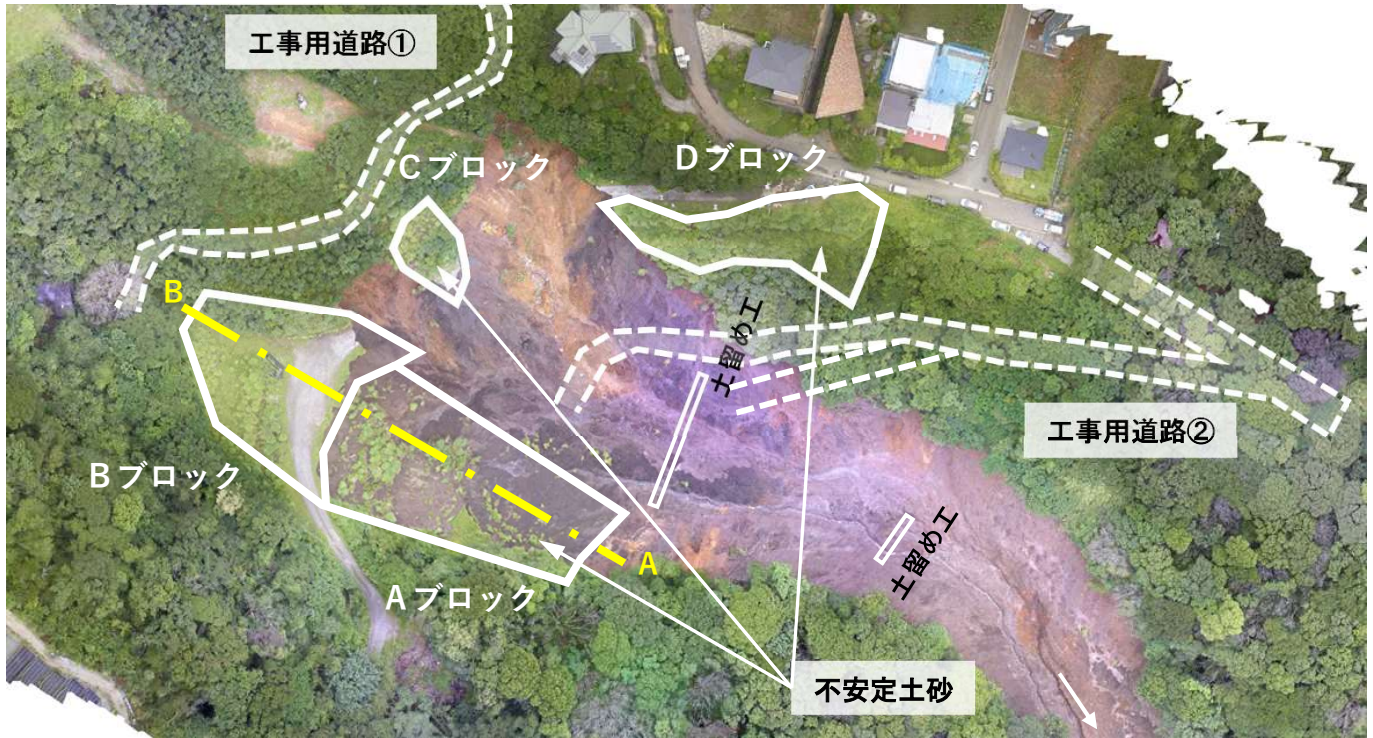

### もっと詳しく知りたいときは・・・

逢初川の復旧に関するご意見、ご質問は、以下のお問合せ先までお気軽にお問合せください。  
 なお、その他の詳しい資料は、熱海土木事務所ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

#### <お問合せ先>

静岡県熱海土木事務所伊豆山地区復興支援課・企画検査課  
 〒413-0016 熱海市水口町13番15号  
 TEL 0557-35-9267 / 0557-82-9171  
 FAX 0557-82-9110



公式HP



ツイッター
