

別紙 1


○計画概要（想定）

計画建物	静岡県食肉センター污水处理施設
所在地	静岡県菊川市赤土地内
敷地面積	47,312.94m ²
施設用途	と畜場に係る污水处理施設
計画処理水量	1,050m ³ /日
流入水質	BOD : 1,500mg/L SS : 1,000mg/L n-Hex : 200mg/L
放流水質	BOD : 20mg/L SS : 20mg/L n-Hex : 30mg/L
想定工期	実施設計 : 令和7年9月～令和8年3月 工事 : 令和8年4月～令和10年度
設計概要	<ul style="list-style-type: none">・ 躯体図面作成・ 躯体構造計算・ 污水处理設備図面作成・ 建築基準法に基づく計画通知等手続業務・ 河川占用協議に係る協議資料作成等・ 概算工事費積算・ 工事費積算・ 工事工程作成
工事概要	【建築工事】建築物躯体工事、既設解体工事(杭含む) 【管工事】污水处理設備工事
その他	<ul style="list-style-type: none">・ 既存污水处理施設を利用しながらのスクラップアンドビルド工事を想定している。・ 令和8年度末までは既存大動物棟の増改築工事が実施されている。・ 施工箇所への搬出入動線は、上記増改築工事及び食肉センター利用者の車両動線と同一の経路を利用する。・ 本工事施工中も食肉センターは稼働しているため、切替による営業への支障を最低限にする施工計画が必要となる。


○事業スケジュール (想定)

区分	構造規模等	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10
小動物新築	鉄骨造 2階建 延べ 6,233 m ²		→			
大動物増築	鉄骨造 1階建 延べ 927 m ² 他			→		
大動物改修	延べ 577 m ²			→		
汚水処理施設	計画処理水量 1,050 m ³ /日	サウンディング	設計		工事	

○既存配置図 (令和8年4月時点)

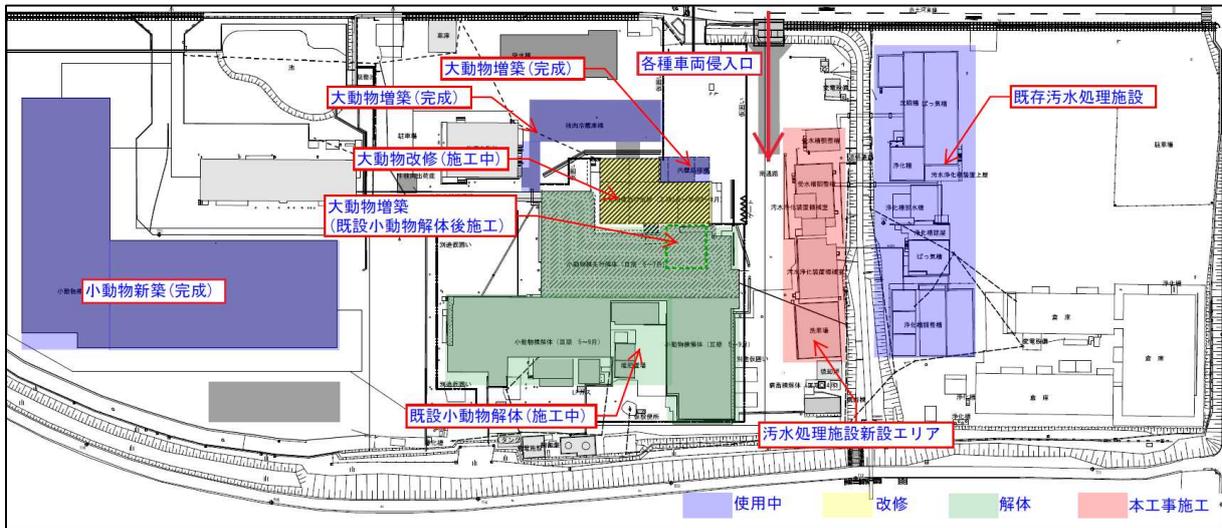

○工事ステップ (想定)

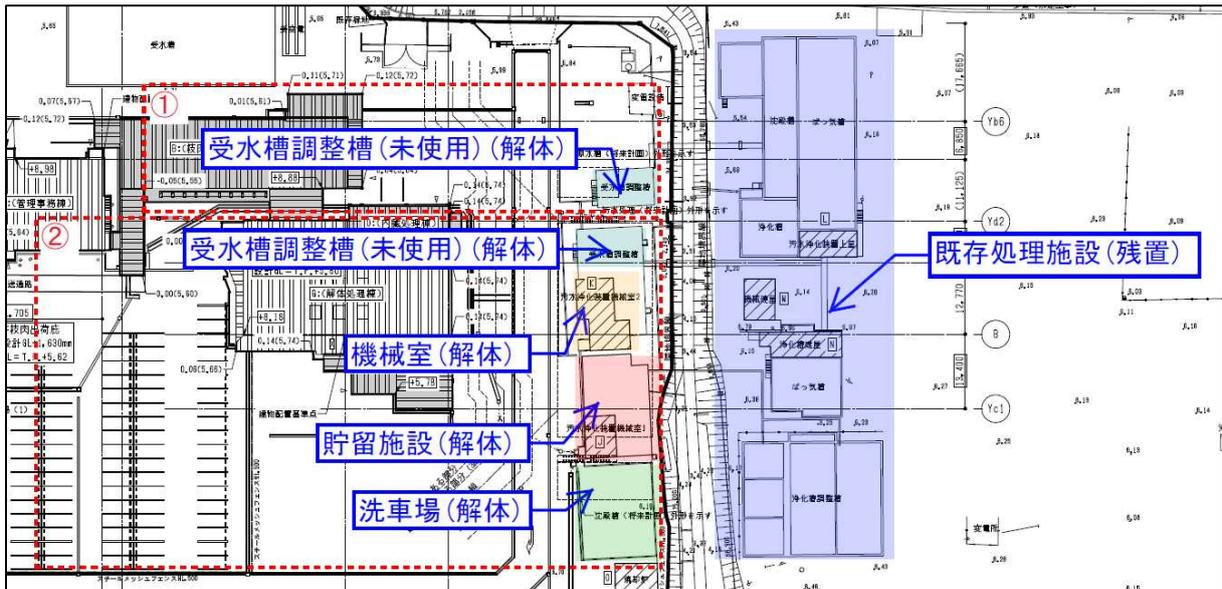

① 受水槽調整槽解体→原水槽新築

※ 新設原水槽及び既存処理施設で仮運用

② 受水槽調整槽、機械室、貯留施設、洗車場解体→処理施設新築

※ 新設原水槽及び新設処理施設で本運用
