


監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成25年1月21日
2 監視員	
3 業者氏名	
4 所在地	伊豆山がれき置場
5 立会者	
6 現地の状況	<p>にて聞き取り調査を行った後、現在分別作業を行っている伊豆山置場に、氏ら立会いのもとで立入調査を行った。</p> <p>現場には、大型重機1台と小型重機が1台あり、作業員2名にて、がれきの分別作業が行われていた。作業は既に4日目ということで、置場内は幾分か整理されており、コンクリートがらは、鉄筋と分別され、コンクリートがらは、再生材として使用するために、ニブラにて40-0mm相当に破砕されていた。</p> <p>また、分別作業を進めていく過程で、想像していたよりも、自然石が多かったため、作業スペースの関係上、赤井谷残土処分場内に一時仮置きしているとのことであった。</p> <p>また、再生材についても、作業スペースの確保の点から、赤井谷に運び、一時仮置きしていく方針とのこと。</p> <p>当面、この作業内容を続け、コンクリートがらの除去作業を継続していくとのこと。また、作業途中で散見された木くず等については、その都度収集し、まとめて処分するとのことであった。</p> <p>今後、から提出される計画書を確認後、具体的な作業内容についてらと調整していく。</p>

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却 埋立 その他
	特別管理産業廃棄物排出事業所				
	下水処理施設				
埋立地を有する事業所			その他処理施設		
	その他		○		
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
特管物			許可対象外 中間処理施設		


伊豆山がれき置場入口付近

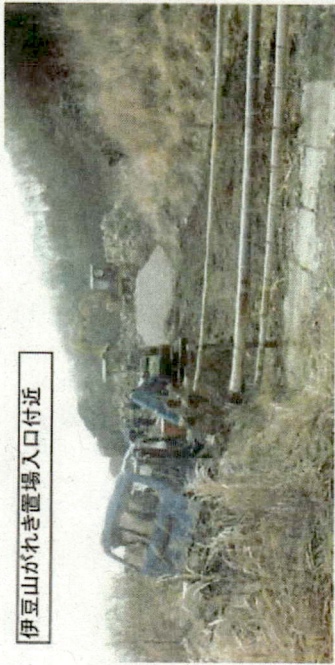

赤井谷残土処分場



天然石を分別し、仮置きしている。

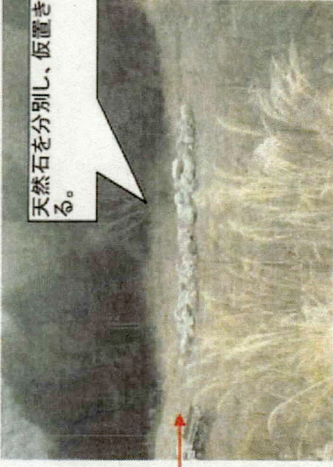

置場内の様子



分別した鉄筋



置場内の様子





ニブラにて破砕した再生
砕石
