現実(基礎ピット無しVer)

工　程　表

案件名	静岡 県	名称： №8　浜松・都田	連 系 予 定 日	2027/4月末
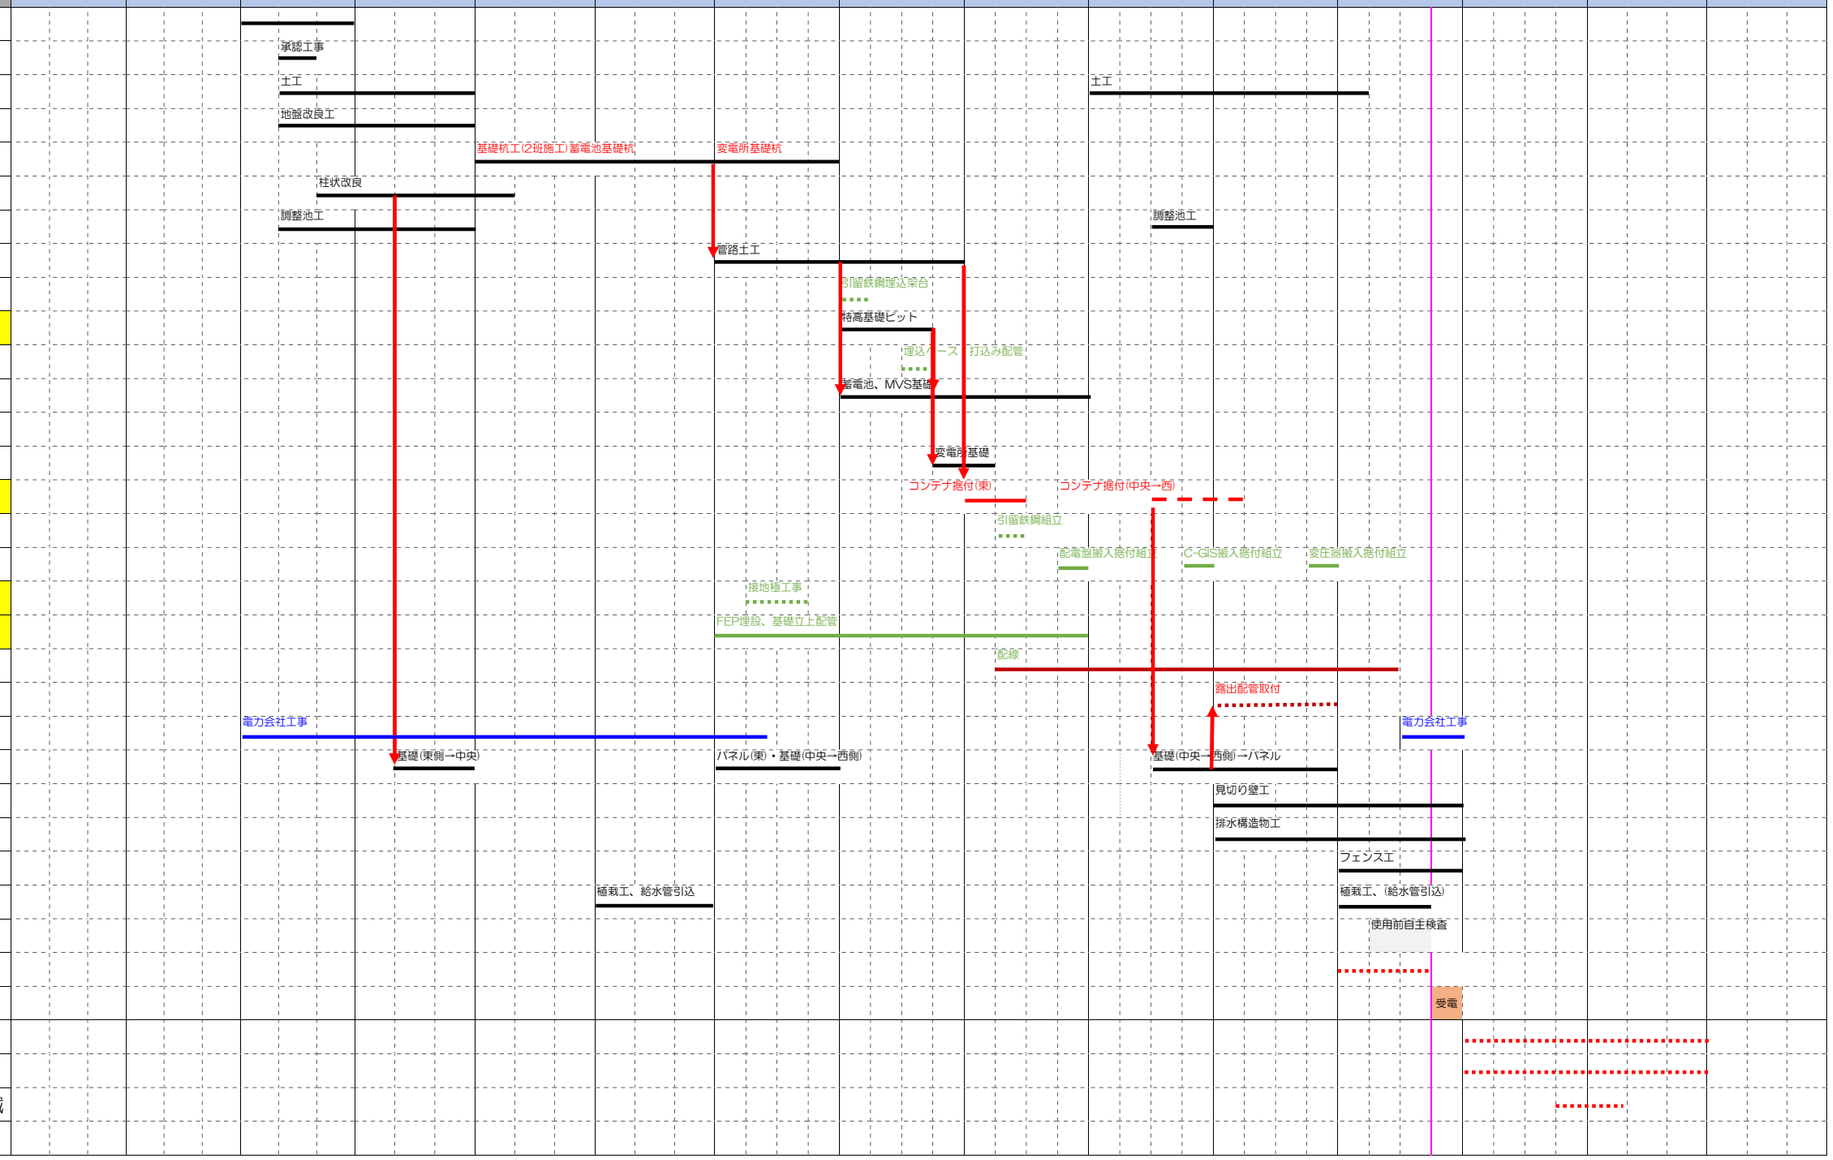
大項目	小項目	備考
工事	準備工	
	道路承認工事	東側市道
	土工(伐開除根含む)	
	地盤改良工	場内通路、調整池、その他
	基礎杭工	蓄電池基礎、変電所基礎
	柱状改良工	防音壁基礎
	調整池工	
	管路土工	
	引留鉄鋼用埋込架台設置（NEC）	※仮で記入（別途確認）
	特高基礎ピット工	蓄電池、MVS基礎ピット除外
	特高基礎埋込ベース設置（NEC）	※仮で記入（別途確認）
	蓄電池、MVS基礎工	架台組立含む
	引留鉄鋼基礎工	
	変電所基礎工	
	コンテナ据付	2027/1月納入
	引留鉄鋼組立（NEC）	※引留鉄鋼基礎完了後実施
	特高受変電設備据付（NEC）	
仮記入	接地極工事(NEC)	※詳細は別途調整させて欲しい。
仮記入	埋設配管工事(NEC)	※詳細は別途調整させて欲しい。
	配線工事(NEC)	
	電力用配管工事(NEC)	※電力用専用回線等　※別途確認
	電力会社工事	※3月入手の内容にて記載
	防音壁工	
	見切り壁工	
	排水構造物工	
	フェンス工	
	植栽工、給水管引込工事	
	使用前自主検査（NEC）※受電前	
	SUNGROW試験調整	※受電前　※仮で記載
受電		
	SUNGROW試験調整	※受電後　※仮で記載
	富士IT試験調整	※受電後　※仮で記載
	使用前自主検査	※受電後（負荷遮断試験等）　※仮で記載
