


新車両基地工事 月間工程表

令和8年10月

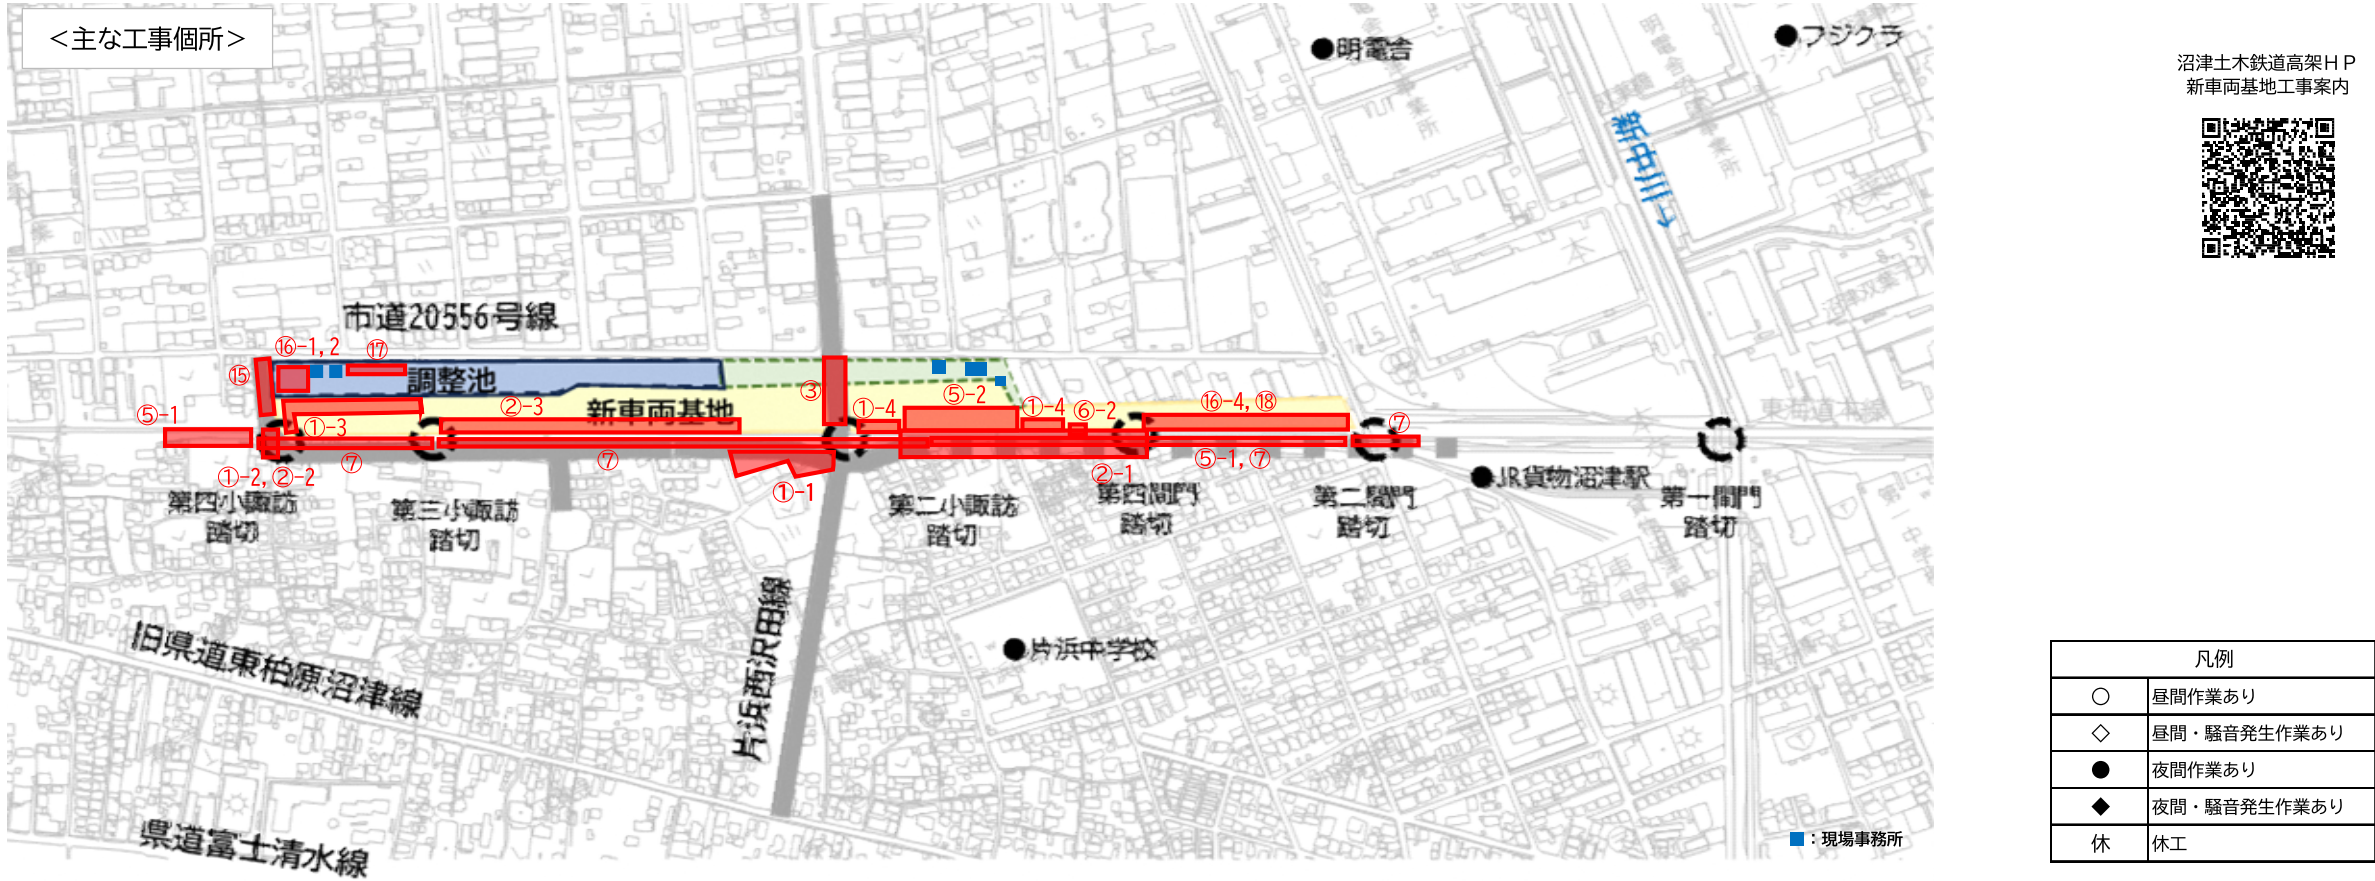

| 施工業者 |              |       | 施工場所 | 主な工事の内容              | 令和8年10月 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |                     | 備考                  |
|------|--------------|-------|------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------------------|---------------------|
|      |              |       |      |                      | 1<br>木  | 2<br>金 | 3<br>土 | 4<br>日 | 5<br>月 | 6<br>火 | 7<br>水 | 8<br>木 | 9<br>金 | 10<br>土 | 11<br>日 | 12<br>月 | 13<br>火 | 14<br>水 | 15<br>木 | 16<br>金 | 17<br>土 | 18<br>日 | 19<br>月 | 20<br>火 | 21<br>水 | 22<br>木 | 23<br>金 | 24<br>土 | 25<br>日 | 26<br>月 | 27<br>火 | 28<br>水 | 29<br>木 | 30<br>金        | 31<br>土             |                     |
| 1    | 名工・熊谷・竹中土木JV |       | ①-1  | 地下道工事                | ○       | ○      | ○      | 休      | ○      | ○      | ○      | ○      | 休      | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○              |                     |                     |
|      |              |       | ①-2  | 踏切拡幅工事               | ◇       | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休              | ※道路規制あり。別紙規制図参照     |                     |
|      |              |       | ①-3  | L型擁壁・仮囲い設置           | ○       | ○      | ○      | 休      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休              |                     |                     |
|      |              |       | ①-4  | 支障物撤去・仮線路盤工          | 休       | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○              | ○                   |                     |
| 2    | 双葉鉄道工業(株)    |       | ②-1  | マクラギ更換               | 休       | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | ◇       | 休       | ◇◆      | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | ◇◆      | ◆              | 夜間作業：第四間門踏切～第二小諏訪踏切 |                     |
|      |              |       | ②-2  | 踏切拡幅工事               | 休       | ○◆     | ◆      | 休      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | 休       | 休       | ○       | ○       | ○●      | ●       | 休       | ●       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休              | 休                   | 夜間作業：第四小諏訪踏切付近      |
|      |              |       | ②-3  | 仮線新設                 | ◇       | ◇      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休              |                     |                     |
| 3    | 名工建設(株)      |       | ③    | 地下道工事                | ○       | ○      | ○      | 休      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○              | ※道路規制あり。別紙規制図参照     |                     |
| 5    | 新生テクノス(株)    | 電車線   | ⑤-1  | 電柱新設工事               | ○●      | ○      | ○      | ○●     | 休      | 休      | ○      | ○      | ○      | 休       | ●       | 休       | ○       | ○●      | 休       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○●      | 休       | ●       | ●       | 休       | ○       | ○       | ○              | 休                   | 夜間作業：第二間門踏切～第二小諏訪踏切 |
|      |              |       | ⑤-2  | 仮線電柱新設工事             | 休       | 休      | 休      | ●      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | ●       | 休       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○●      | 休       | ●       | ●       | 休       | ○       | ○       | ○       | 休       | 夜間作業：第二小諏訪踏切付近 |                     |                     |
| 6    | 新生テクノス(株)    | 電力    | ⑥-1  | 避雷線移転                | 休       | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       |                |                     |                     |
|      |              |       | ⑥-2  | 変圧器撤去                | 休       | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | 休       | ○       | ○       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休              |                     |                     |
| 7    | 新生テクノス(株)    | 信号・通信 | ⑦    | ケーブル布設, 電柱, 基礎 新設, 他 | 休       | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       |                |                     |                     |
| 15   | 名工建設(株)      |       | ⑮    | 道路築造工事               | 休       | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | 休       | ◇       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休              | ※道路規制あり。別紙規制図参照     |                     |
| 16   | (株)川村組       |       | ⑮-1  | 残土搬出                 | 休       | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休              |                     |                     |
|      |              |       | ⑮-2  | 調整池工事                | ○       | ○      | 休      | 休      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | 休       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○              | 休                   |                     |
|      |              |       | ⑮-3  | 市道20694号線（第3小諏訪踏切）   | 休       | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休       | 休              |                     |                     |
|      |              |       | ⑮-4  | 構造物取壊し工事             | 休       | 休      | 休      | 休      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | 休       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○              | 休                   |                     |
| 17   | (株)東土建       |       | ⑰    | 調整池工事                | ○       | ○      | 休      | 休      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | 休       | 休       | ◇       | ◇       | ◇       | ◇       | ◇       | 休       | 休       | ◇       | ◇       | ◇       | ◇       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休              | ※道路規制あり。別紙規制図参照     |                     |
| 18   | (株)植松建設      |       | ⑮    | 掘削工                  | 休       | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休              |                     |                     |
|      |              |       | ⑮    | 除草工                  | 休       | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | 休       | 休       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○              | 休                   |                     |
|      |              |       | ⑮    | 構造物取壊し工              | 休       | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休      | 休       | 休       | 休       | ◇       | ◇       | ◇       | ◇       | 休       | 休       | ◇       | ◇       | ◇       | ◇       | ◇       | 休       | 休       | ◇       | ◇       | ◇       | ◇       | ◇              | 休                   |                     |

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。 ◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締め固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。
