

静岡県では沼津駅付近鉄道高架事業について徹底した合意形成を図るため、パブリックインボルブメント(PI)を実施することとしました。このPI実施計画は今後実施するPIの進め方、実施体制などを定めたものです。


●最大限のコミュニケーションを図っていきます ～沼津高架PIプロジェクトとは～

沼津駅付近鉄道高架事業は、事業着手から約10年が経過しました。これまでの県の取組みを振り返ると、市民の皆さんとの対話やニーズの把握が十分でなく、結果的に行政の進め方に対する不信や不満を抱かせてしまい、率直に反省しております。

そこで、静岡県では、平成23年6月の沼津駅付近鉄道高架事業に関する有識者会議の報告書を受けた県の推進方針に基づき、改めて沼津駅付近鉄道高架化に係る一連の計画についての方向付けをするため、沼津高架PIプロジェクトを立ち上げました。

沼津高架PIプロジェクトでは、鉄道高架化や駅周辺開発、貨物駅の移転など様々な論点について考え得る案を予断なく検討し、市民や関係者の皆さんと徹底したコミュニケーションを図りながら意見を聴き、オープンに議論します。これらは、第三者の有識者で構成するPI委員会が監視し、助言・評価することで、透明性、客観性、公正性を確保します。


このような取組により、市民や関係者の皆さんのニーズを把握、反映し、信頼の確保に努めます。

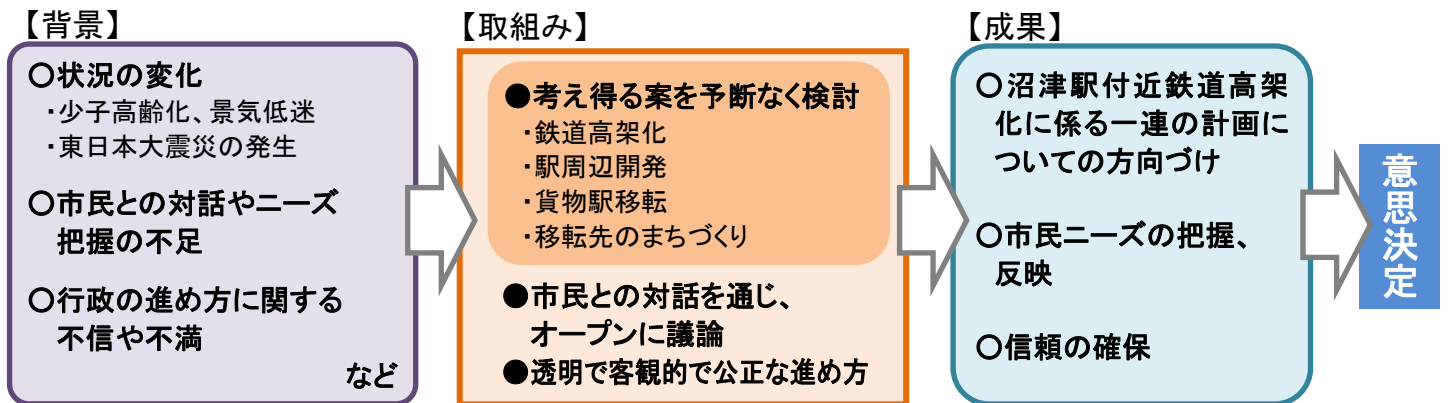

●互恵的解決を目指します ～沼津高架PIプロジェクトのビジョン～

沼津高架PIプロジェクトでは、正当な理由なく私益が犠牲になるような不条理や多くの市民が不利益を被る状況避ける(不幸を生まない)ことで地域や個人にとっても、公益にとっても相互に価値のある解決策を模索します。

そこで、以下の3点をPIの基本理念として、現在のような複数の論点がぶつかり合ったり絡み合ったりしている二項対立的状況を脱却し、互恵的解決を目指します。

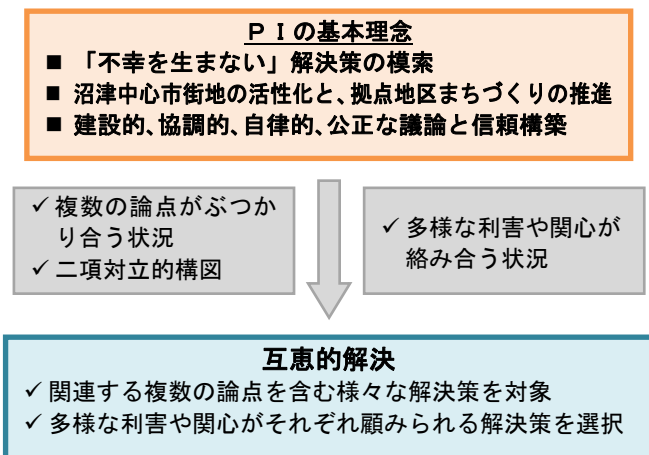

●予断なく、透明で客観的で公正に進めます ～沼津高架PIプロジェクトの進め方～

- ①議論が混乱しないよう、段階的にステップを踏み、一つ一つ確認しながら進めるプロセスとします。
- ②検討の進め方をPI実施計画で明確にし、市民等と共有することで公正に進めます。
- ③まずは目指すべきゴールを確定し、その後、計画内容を確定していきます。
- ④計画内容は、様々な角度から複数の案を見比べ、どの計画が総合的に良いかを検討します。
- ⑤各ステップでPIを実施し、直接的・間接的に多重多層の対話を行い、相互の理解を図ります。

●沼津高架PIプロジェクトは、PI委員会が監視し、助言、評価します。PIプロジェクトで検討した結果を判断材料にして、意思決定がなされます。



●まずは目指すべきゴールを明確にし、一つ一つ確認しながら進めていきます ~沼津高架PIプロジェクトのプロセス~

検討のステップ	H23年度		H24年度			
	Step1 PI実施計画の策定	Step2 ゴール(目標)の設定	Step3 代替素案(論点ごと)と評価項目の設定	Step4 代替案(パッケージ)と評価項目の設定	Step5 代替案の比較評価	Step6 推奨案の選定
検討内容	沼津高架PIプロジェクトの進め方を定めたPI実施計画を策定します。	鉄道高架や貨物駅移転、さらには沼津全体や移転先地区の現在の問題や将来像を検討し、プロジェクトのゴール(目標)を定めます。	目指すべきゴールを達成するための複数の代替案を予断なく検討し、比較評価の視点を設定します。 まずは論点となるテーマごとに代替素案を検討し、次にそれらを組み合わせ、相互に関連づけた代替案を検討します。		代替案を比較評価します。	意思決定にあたり推奨する案を選定するとともにその根拠を整理します。
コミュニケーションの方法	ホームページ・ニュースレターなど PI実施計画	Step2_PI手法 Step2_確定内容 Step3_PI手法	Step3_確定内容 Step4_PI手法	Step4_確定内容 Step5_PI手法	Step5_確定内容 Step6_PI手法	Step6_確定内容 PI結果の総括
PI委員会	審議 PI実施計画への助言	PIの監視 審議 Step2_PI手法助言 Step2_PI結果評価 Step3_PI手法助言	PIの監視 審議 Step3_PI結果評価 Step4_PI手法助言	PIの監視 審議 Step4_PI結果評価 Step5_PI手法助言	PIの監視 審議 Step5_PI結果評価 Step6_PI手法助言	PIの監視 審議 Step6_PI結果評価 PI結果の総括

●多くの論点を総合的に判断することが求められています~議論のテーマ~

議論の内容は幅広いものになるため、まずは、テーマを3つに分けて議論を進めます。その後、3つのテーマは相互に関連するので、それぞれを関連づけ、組み合わせながら検討していきます。

テーマ① 広域レベル

- 鉄道高架化に係る一連の計画の意義
- 貨物駅の近傍駅統合や現位置での存続の可能性など

ホームページやニュースレター等で情報を提供し、オープンハウスや車座談議等で意見交換します。テーマ②③で実施する勉強会での議論も踏まえ、専門家の助言を得ながら検討を進めます。

テーマ② 地区レベル(沼津駅周辺)

- 鉄道高架事業の計画内容や事業スケジュール
- 沼津駅周辺の開発の計画内容や事業スケジュールなど


ホームページやニュースレター等で情報を提供し、オープンハウスや車座談議等で意見交換します。また、勉強会でも議論しながら検討を進めます。

テーマ③ 地区レベル(貨物駅移転先)

- 貨物駅の移転先とまちづくり
- 貨物駅移転先の拠点形成など

ホームページやニュースレター等で情報を提供し、オープンハウスや車座談議等で意見交換します。また、勉強会でも議論しながら検討を進めます。

●複雑な議論を整理しながら進めます ~議論の内容~

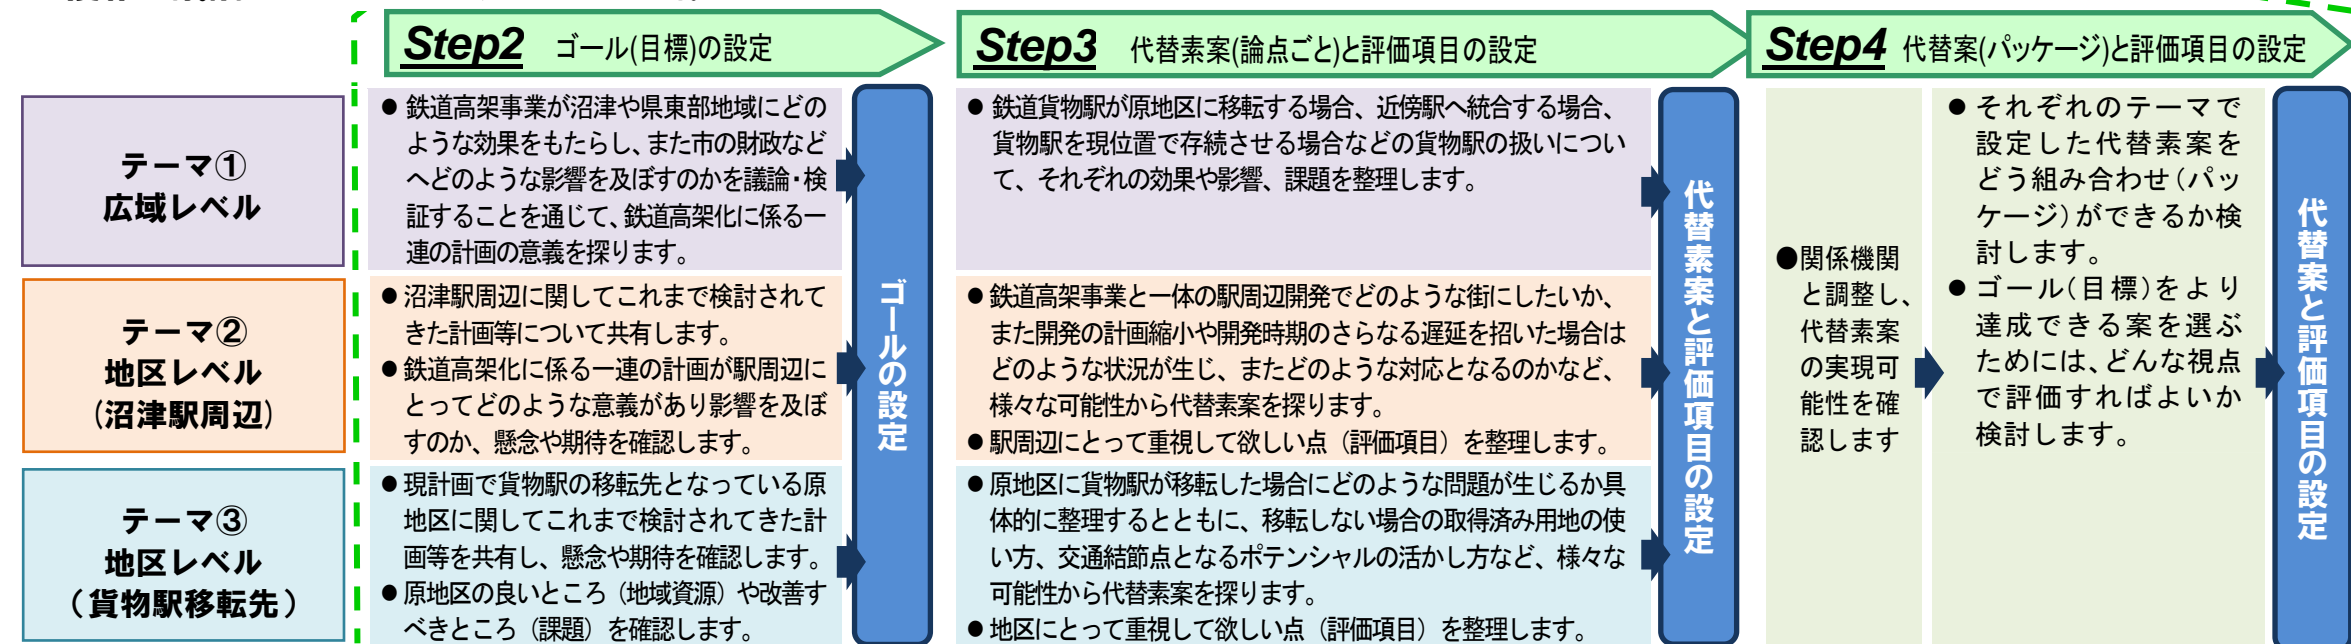

●多重多層にコミュニケーションを図ります ~コミュニケーションの方法~

広く情報を提供する手法や、関心の高い人と議論できる手法など、多様なPI手法を活用し、地域のニーズを把握します。

↑ 広く ↓ 深く

- ホームページ、ニュースレターなど
- オープンハウス
- 車座談議
- 勉強会

◆ホームページ・ニュースレター

沼津高架PIプロジェクトの検討状況や各ステップで決まったことなどを、ホームページやニュースレター(広報誌)でお知らせします。ニュースレターは沼津市内の随所で配布します。

◆オープンハウス

市民の皆さんの集まる場所で、計画に関する情報や進捗状況などをパネル展示で情報提供し、PI運営事務局などがご意見を伺います。市民の皆さんが情報を提供する機会も設けます。

◆車座談議

PI運営事務局などが自治会や団体へ伺い、鉄道高架化に係る一連の計画、市全体や駅周辺の計画などについて情報を提供し、意見交換することで、情報の共有を図ります。皆さんからの開催要望にも応じます。


◆勉強会

鉄道高架化計画に関心のある主な自治会や団体などから代表者を推薦して頂き、これまでの計画やまちづくりの考え方などを共有しながら鉄道高架化計画の意義や地区の資源、課題、代替案や評価項目に関して議論します。仲介者の第三者を交え、同じメンバーで継続的に進めます。テーマ②とテーマ③に関する勉強会をそれぞれ設置し、テーマ①の議論も交えながら進めます。

●透明で客観的で公正な体制で進めます ～実施体制～

沼津高架PIプロジェクトは透明で客観的で公正に進める必要があります。
そのために次のような体制で進めていきます。

- ・ 最終的な意思決定は意思決定者が行います。
- ・ 沼津高架PIプロジェクト推進本部は、各ステップを多様な利害や関心を踏まえながら一つ一つ確定します。また、意思決定にあたり、計画の推奨案を選定します。
- ・ PI運営事務局は、市民や関係者の皆さんとコミュニケーションを図るPIを専任的に担います。
- ・ 計画検討チームは、技術的な計画検討を行います。必要に応じ、専門家から助言を受けながら進めていきます。
- ・ まちづくり専門家などの第三者が、コミュニケーションの場での議論の仲介役を担うとともに、第三者の視点でも情報発信をします。

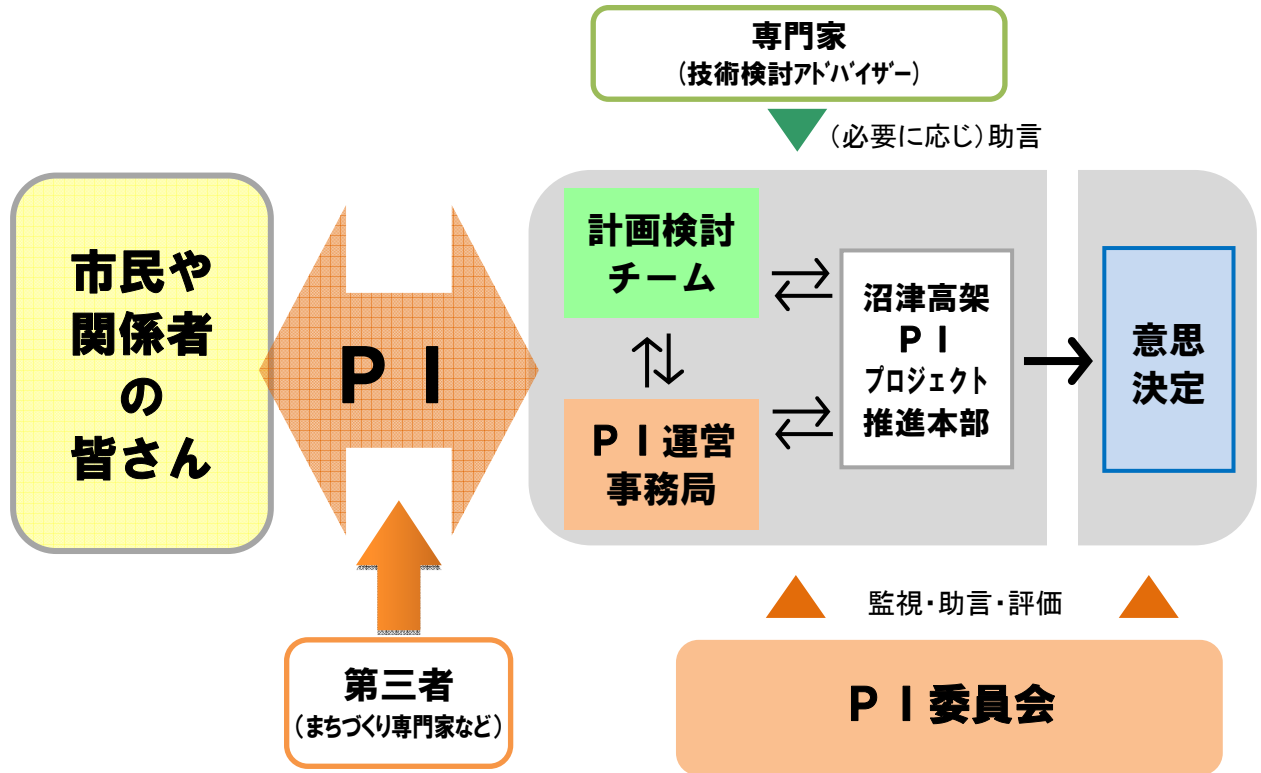

◇PI委員会の役割

PI委員会は、PIが透明で客観的に公正に進められているかを監視し、助言・評価します。

【PI委員会による監視、助言、評価の視点】

- ✓ 多様な利害や関心を調整して互恵的な解決を模索しているか
- ✓ どのステップの検討をしているか明確にしながらか進めているか
- ✓ 議論が混乱しないよう、各ステップの趣旨に応じた検討を行っているか
- ✓ 多様な利害や関心を踏まえた上で、目的や代替案、評価項目を設定しているか
- ✓ 市民や関係者との多重多層のコミュニケーションを行っているか
- ✓ 積極的かつ適切に情報を提供しているか、十分に意見を聴き論点を把握しているか
- ✓ PI委員会の助言を踏まえて、適切にPIを実施しているか

PI実施計画(案)についてご意見をお寄せください！～パブリック・コメントを受け付けています～

●皆さんからいただいたご意見を踏まえ、PI実施計画(案)を修正し、PI実施計画を策定します

静岡県では、平成23年11月に「沼津駅付近鉄道高架事業に関するPI委員会」を設け、PIの基本的な考え方等の助言を頂きながら、PI実施計画(案)を策定しました。この(案)についての市民の皆さんの意見やニーズを踏まえ、今後修正し、PI実施計画を策定します。ぜひご意見をお寄せください！

コメント受付期間:平成24年2月●日～3月●日

FAX:●●(●●)●●● E-mail:●●●●@●●●●●●●●

静岡県 交通基盤部 都市局 街路整備課 ・ 沼津土木事務所 都市計画課
